

Barrancabermeja, Junio 9 de 2017

Doctor

**PEDRO LUIS LOBO SAUCEDO**  
Secretario Concejo Municipal  
Barrancabermeja - Santander

 **CONCEJO MUNICIPAL**  
BARRANCABERMEJA  
Fecha: 09 JUN 2017 Hora: 2:35 PM  
Recibido por: [Signature] 08-14

Asunto: Remisión Complemento al Informe de Gestión de la Secretaria de Infraestructura para el periodo Febrero – Mayo de 2017.

Cordial saludo

En atención al acuerdo 059 de 2006 hago llegar a su despacho el complemento del informe de la Secretaria de Infraestructura correspondiente al periodo comprendido entre el primero de Febrero y el treinta y uno de mayo del año 2017.

Anexo: Dieciocho copias en medio físico  
Un (1) CD – contiene el complemento del informe


Atentamente

CORRESPONDENCIA OFICINA  
PLANEACION MUNICIPAL

Barrancabermeja  
Fecha: 13 JUN 2017  
Recibido: [Signature]  
ra: 11:10 AM

B P P M

  
**GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**  
Secretario de Infraestructura

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mario Daniel Hernández Fletscher		Junio 9 de 2017
Elaboró:	Mario Daniel Hernández Fletscher		Junio 9 de 2017
Revisó - Aprobó:	Mario Daniel Hernández Fletscher		Junio 9 de 2017
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma.			



**LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL**  
**SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**PROGRAMA: ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y**  
**SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.**  
**SUBPROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: 1-0016-2015**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO  
"ADECUACION DE LAS MINIPTARS DEL MUNICIPIO DE  
BARRANCABERMEJA" APORTANTES CORMAGDALENA, AGUAS DE  
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

**VALOR DEL CONVENIO:** DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES  
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS  
M/CTE (\$ 10.724'662.413,00).

**VALOR APOORTE CORMAGDALENA:** SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS  
(\$ 7.500.000.000)

**VALOR APOORTE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P:** DOSCIENTOS  
NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL  
CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 296.796.047)

**VALOR APOORTE MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA:** DOS MIL NOVECIENTOS  
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL  
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.927.866.366).

**FECHA ACTA DE INICIO:** 12 de mayo de 2016

**FECHA DE TERMINACION:** 29 de junio de 2017

**OBSERVACION:** El contratista de la obra es la empresa SERVICIVIL LTDA Contrato de  
Obra Pública N° 083 del 5 de mayo de 2016 y la interventoría es la empresa INGAP  
LTDA, contrato de Interventoría N° 084 del 5 de mayo de 2016. Las obras civiles  
empiezan el día 01 de junio de 2016.

**META PLAN DE DESARROLLO:** Optimizar 9 mini-PTAR existentes, durante el cuatrienio.

**META PROGRAMADA VIGENCIA 2017:** Optimizar 2 mini-PTAR

**EJECUTADO:** 0

**CONTRATO No.: 083-16**

**OBJETO:** ADECUACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINIPTAR'S DEL  
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – Convenio Interadministrativo 1-0016-  
2015

**VALOR INICIAL:** SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS  
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS (\$  
7.231.566.314.00) M/CTE.

**% DE AVANCE FÍSICO:** 84.00 %

**% AVANCE EN TIEMPO:** 75.00 %

**% AVANCE FINANCIERO:** 90.00%

**FECHA DE INICIO:** 12 de Mayo de 2016

**PLAZO INICIAL:** 12 MESES

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 10 de Febrero de 2017

**ACTA PRORROGA 1 SUSPENSION No. 01:** 07 de Abril de 2017

**ACTA PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 01:** 10 de Mayo de 2017

**ACTA DE REINICIO No. 01:** 31 de Mayo de 2017

**COMUNAS:** 4 Y 7




**ALCANCE DEL CONTRATO:** El proyecto consiste en la adecuación, puesta en marcha y operación y mantenimiento de nueve (9) miniptars ubicadas en los barrios Almendros, Bosques de la Cira, altos de Cañaveral, altos del Cincuentenario, Asoprados, Cincuentenario VII etapa, Marsella y Naranjos de la comuna 4 y el barrio Nuevo Horizonte de la comuna 7 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja


MINIPTAR	PORCENTAJE DE AVANCE
LOS ALMENDROS	87%
ALTOS DE CAÑAVERAL	86%
ALTOS DE CINCUENTENARIO	87%
ASOPRADOS	90%
BOSQUES DE LA CIRA	89%
CINCUENTENARIO VII ETAPA	87%
MARSELLA	60%
NARANJOS	86%
NUEVO HORIZONTE	86%

MINIPTAR	DESCRIPCIÓN
ALMENDROS	Zanjón de oxidación, sedimentador, caja homogeneizadora, estructura de ingreso.
ALTOS DE CAÑAVERAL	Zanjón de oxidación, sedimentador, caja de bombas, lechos de secado, Bypass, estructura de ingreso, caseta de operaciones
ALTOS DE CINCUENTENARIO	Zanjón de oxidación, sedimentador, caja de bombas, lecho de secado, estructura de ingreso, caseta de operaciones
ASOPRADOS	Zanjón de oxidación, sedimentadores, caja de bombas, lechos de secado, Bypass, estructura de ingreso y caseta de operaciones
CINCUENTENARIO VII ETAPA	Zanjón de oxidación, sedimentador, caja de bombas, caja homogeneizadora.
BOSQUES DE LA CIRA	Zanjón de oxidación, sedimentadores, caja de bombas, caja homogeneizadora, lechos de secado, estructura de ingreso, caseta de operaciones.
MARSELLA	Zanjón de oxidación, sedimentador, lechos de secado y estructura de entrada.
NARANJOS	Zanjón de oxidación, sedimentador, caja de bombas, lechos de secado, estructura de entrada, caseta de operaciones.
NUEVO HORIZONTE	Zanjón de oxidación, sedimentador, caja de bombas, lecho de secado, estructura de ingreso, caseta de operaciones.



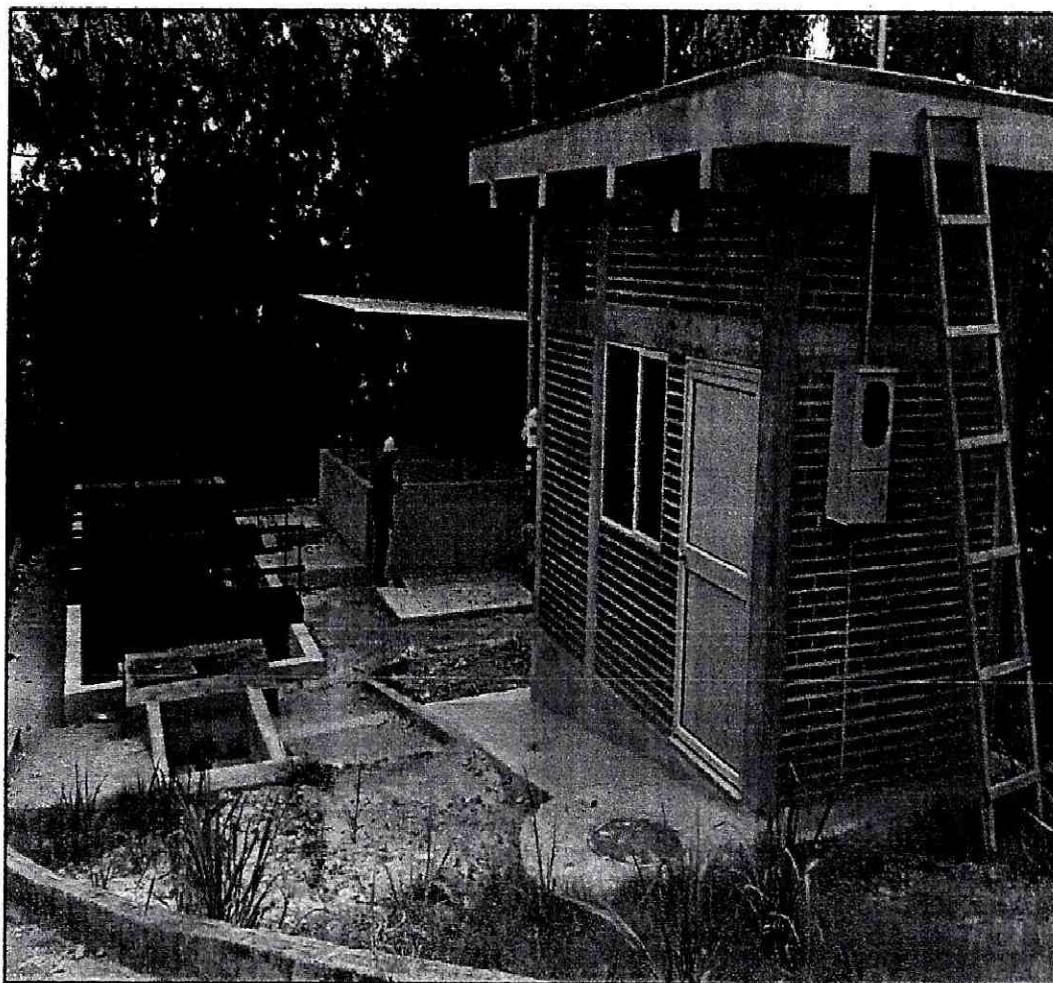


PTAR BARRIO ASOPRADOS ESTADO ACTUAL

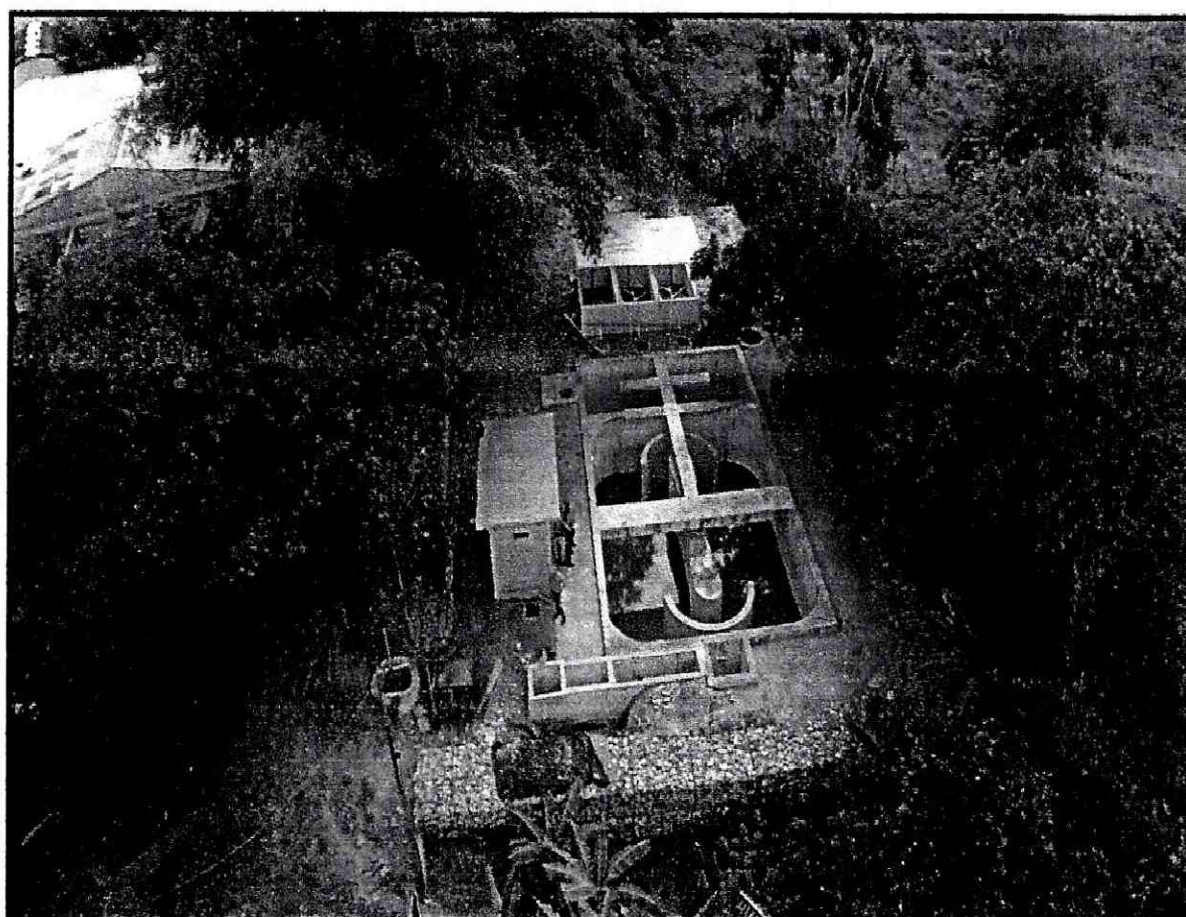


PTAR BARRIO BOSQUES DE LA CIRA ESTADO ACTUAL




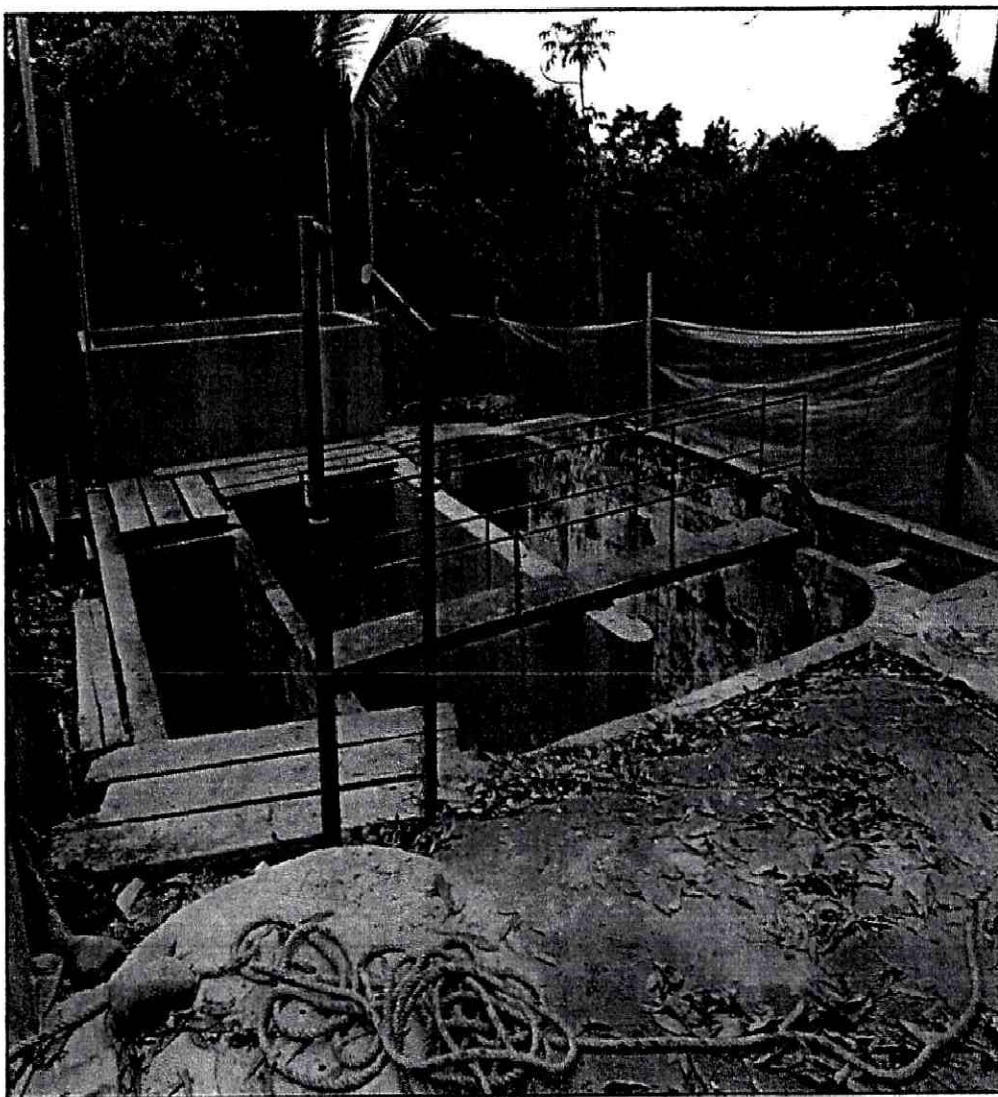

PTAR BARRIO MARSELLA ESTADO ACTUAL

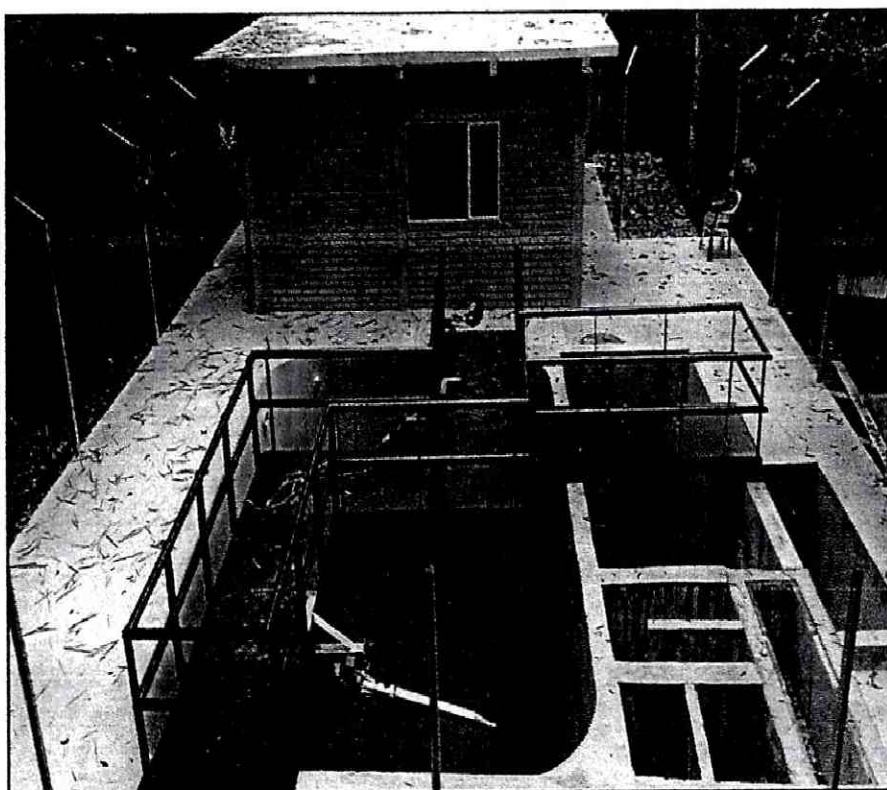

PTAR BARRIO NUEVO HORIZONTE ESTADO ACTUAL

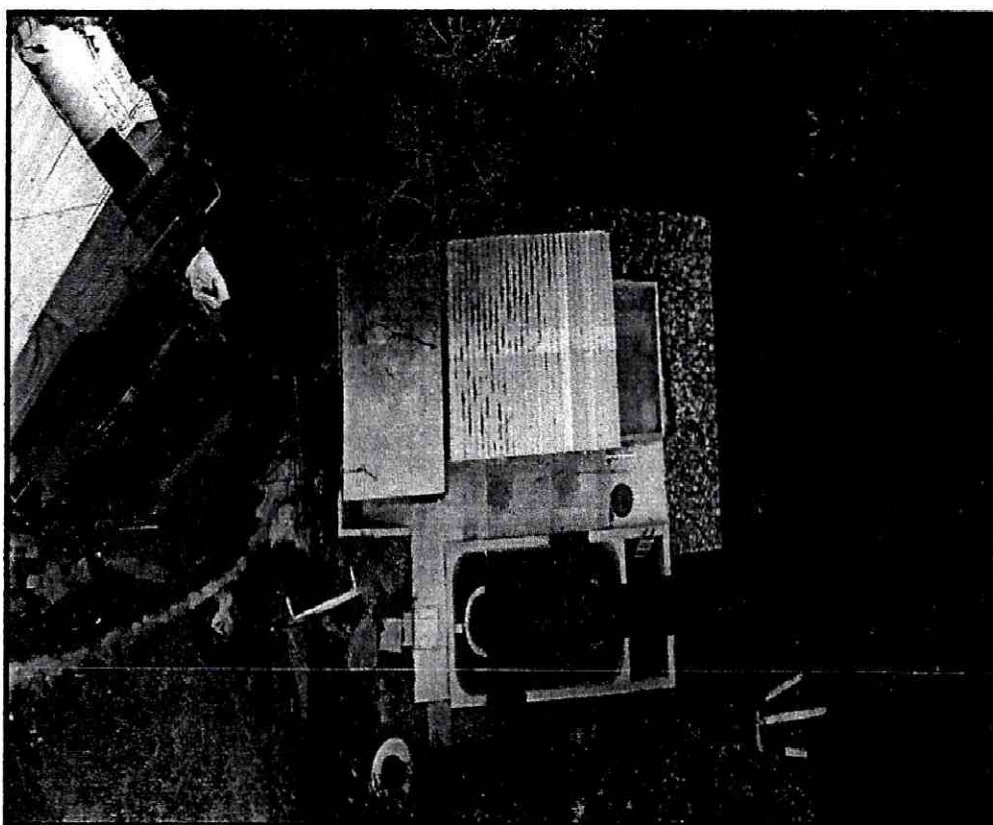


PTAR BARRIO ALTOS DE CAÑAVERAL ESTADO ACTUAL




PTAR BARRIO ALMENDROS ESTADO ACTUAL




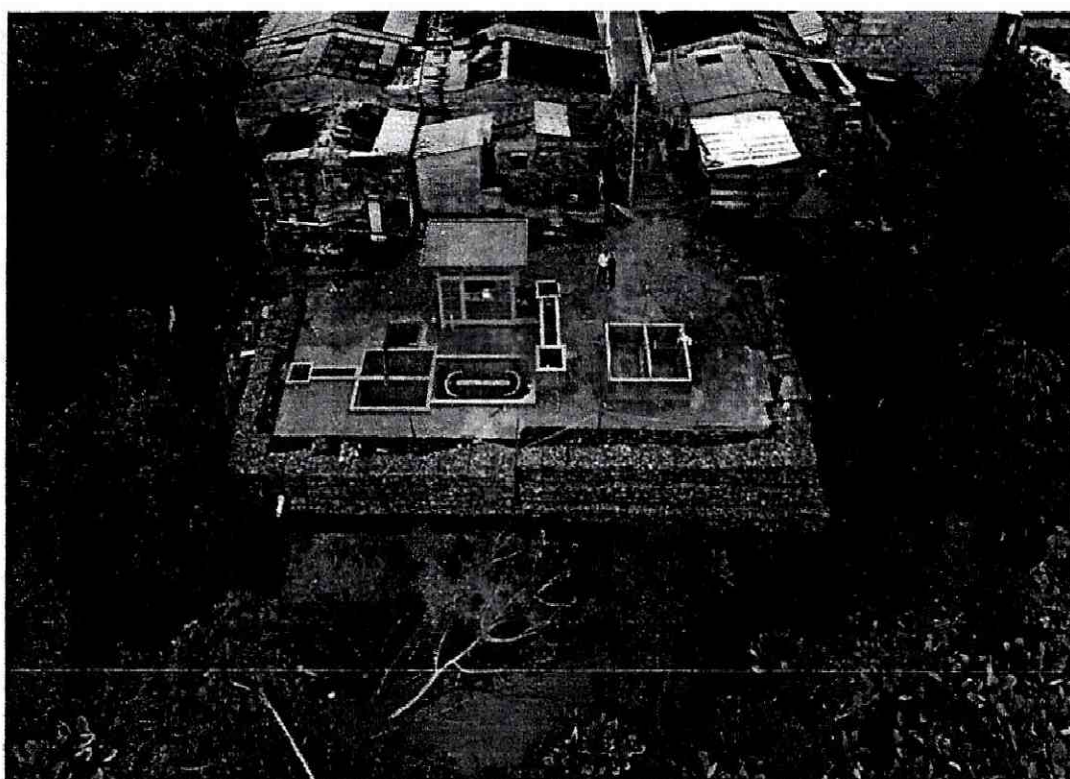

PTAR BARRIO CINCUENTENARIO VII ETAPA ESTADO ACTUAL

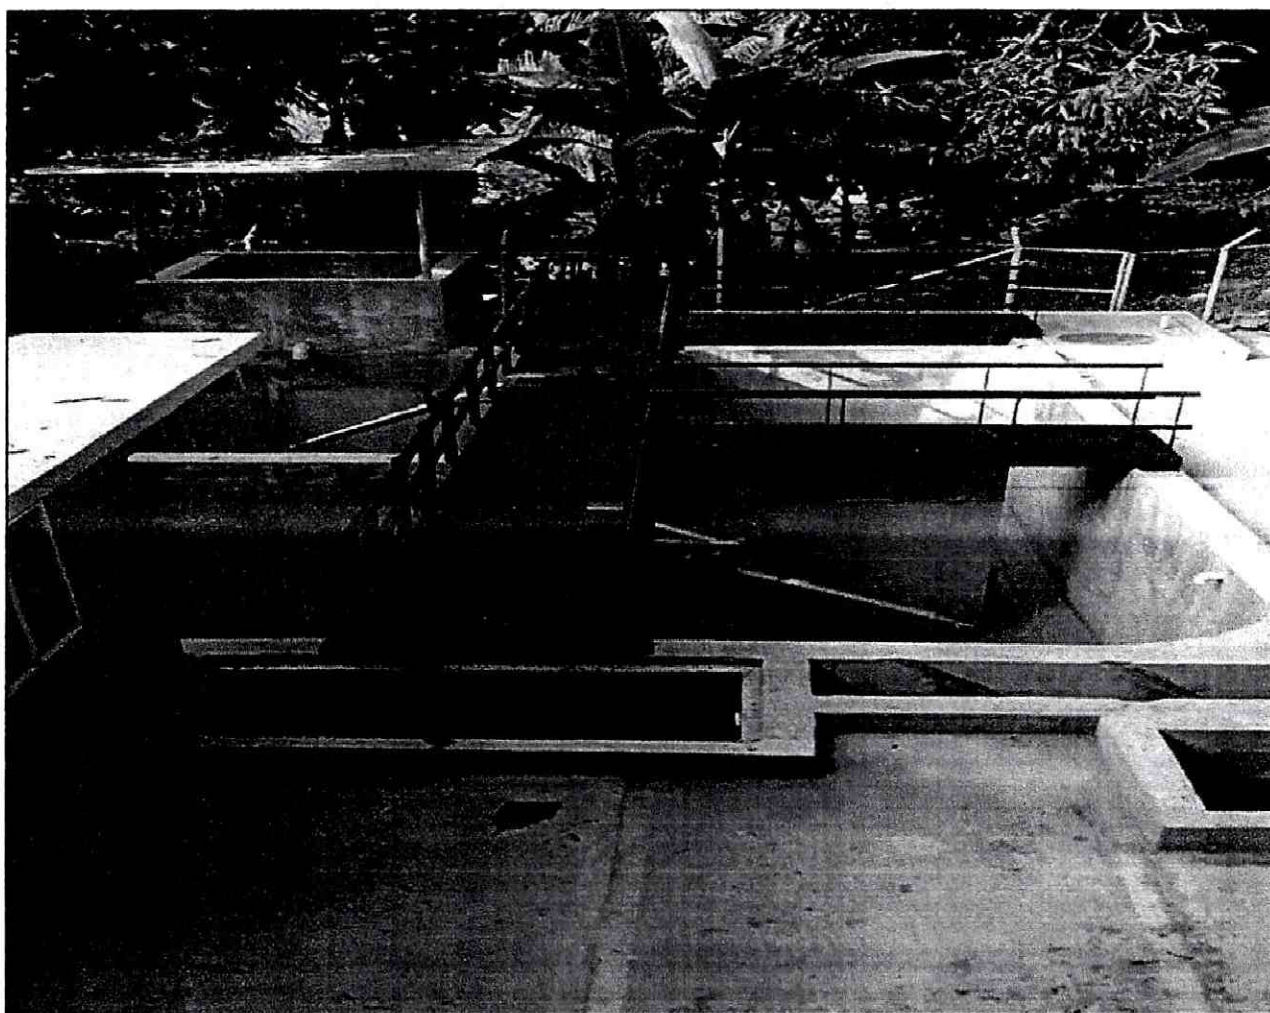

PTAR BARRIO ALTOS DEL CINCUENTENARIO ESTADO ACTUAL

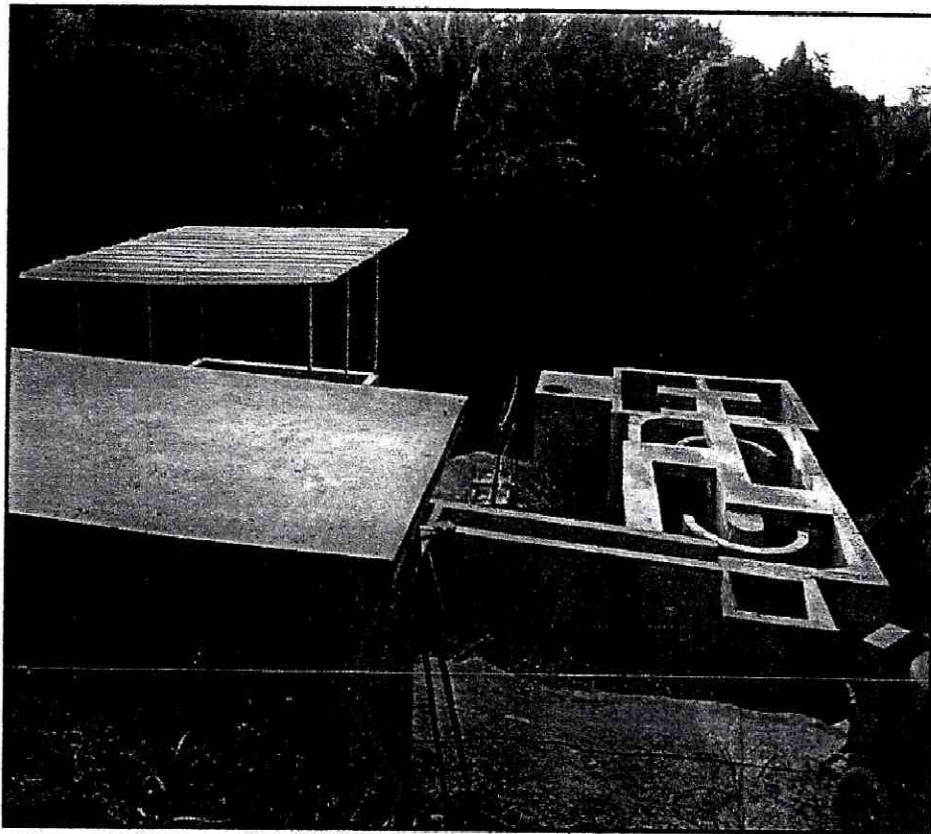

**PTAR BARRIO NARANJOS ESTADO ACTUAL**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 084-16**

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DE LAS MINIPTARS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – Convenio Interadministrativo 1-0016-2015

**VALOR INICIAL:** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHOMIL CIENTO CUARENTA y CINCO PESOS (\$ 559.618.145.00) M/CTE.

**% AVANCE EN TIEMPO:** 75.00 %

**% AVANCE FINANCIERO:** 62.00 %

**FECHA DE INICIO:** 12 de Mayo de 2016

**PLAZO INICIAL:** 12 MESES

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** 10 de Febrero de 2017

**ACTA PRORROGA 1 SUSPENSION No. 01:** 07 de Abril de 2017

**ACTA PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 01:** 10 de Mayo de 2017

**COMUNAS:** 4 Y 7

**ALCANCE DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra No 083-16.

**PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA:** Revisión y control de obra y calidad de las diferentes actividades que se ejecutan por parte del contrato de obra No 083-16.



**LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL**  
**SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**  
**PROGRAMA: ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y**  
**SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.**  
**SUBPROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**CONTRATO No.: 0646-17**

**OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"**

**VALOR INICIAL: TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES ONCE MIL  
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$3.214.011.233,00).**

**FECHA DE INICIO: 10 de Mayo de 2017**

**PLAZO INICIAL: 6 MESES**

**% DE AVANCE FÍSICO: 10.00 %**

**% AVANCE EN TIEMPO: 11.11 %**

**% AVANCE FINANCIERO: 0.00%**

**FECHA TERMINACION: 09 de Noviembre de 2017**

**COMUNAS: 3, 4, 5, 6 Y 7**

**META PLAN DE DESARROLLO: Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y  
rehabilitar 500 ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio.**


**META PROGRAMADA VIGENCIA 2017: 50 metros**

**EJECUTADO: 50 metros**

**ALCANCE DEL CONTRATO: El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de  
tramos de alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios beneficiados en las  
comunidades 3, 4, 5, 6 y 7 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja**


**PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA: Socialización del alcance de  
los trabajos con las comunidades beneficiadas con el proyecto como son barrio  
Los Mandarinos, donde ya se ha realizado las actas de vecindad, replanteos,  
excavaciones, instalación de tubería y construcción de pozos de inspección.**



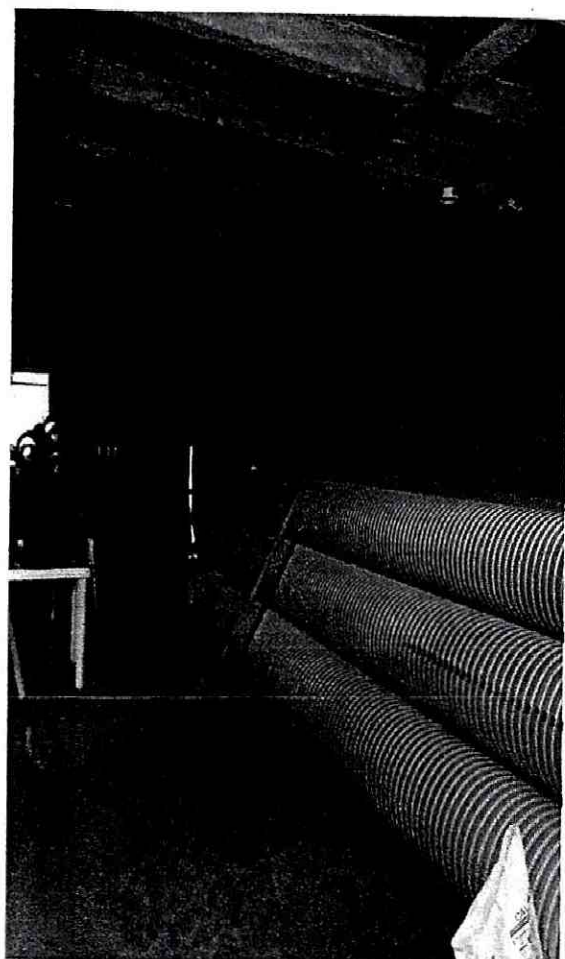

Almacenamiento de tubería



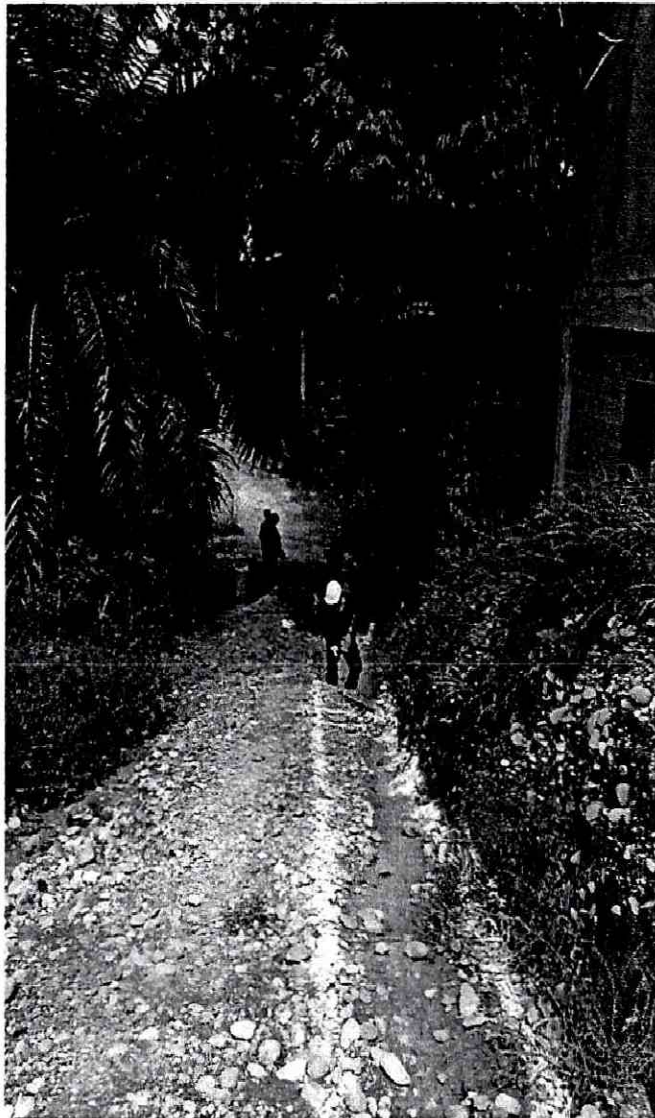


Demarcación de excavaciones




Excavación a maquina



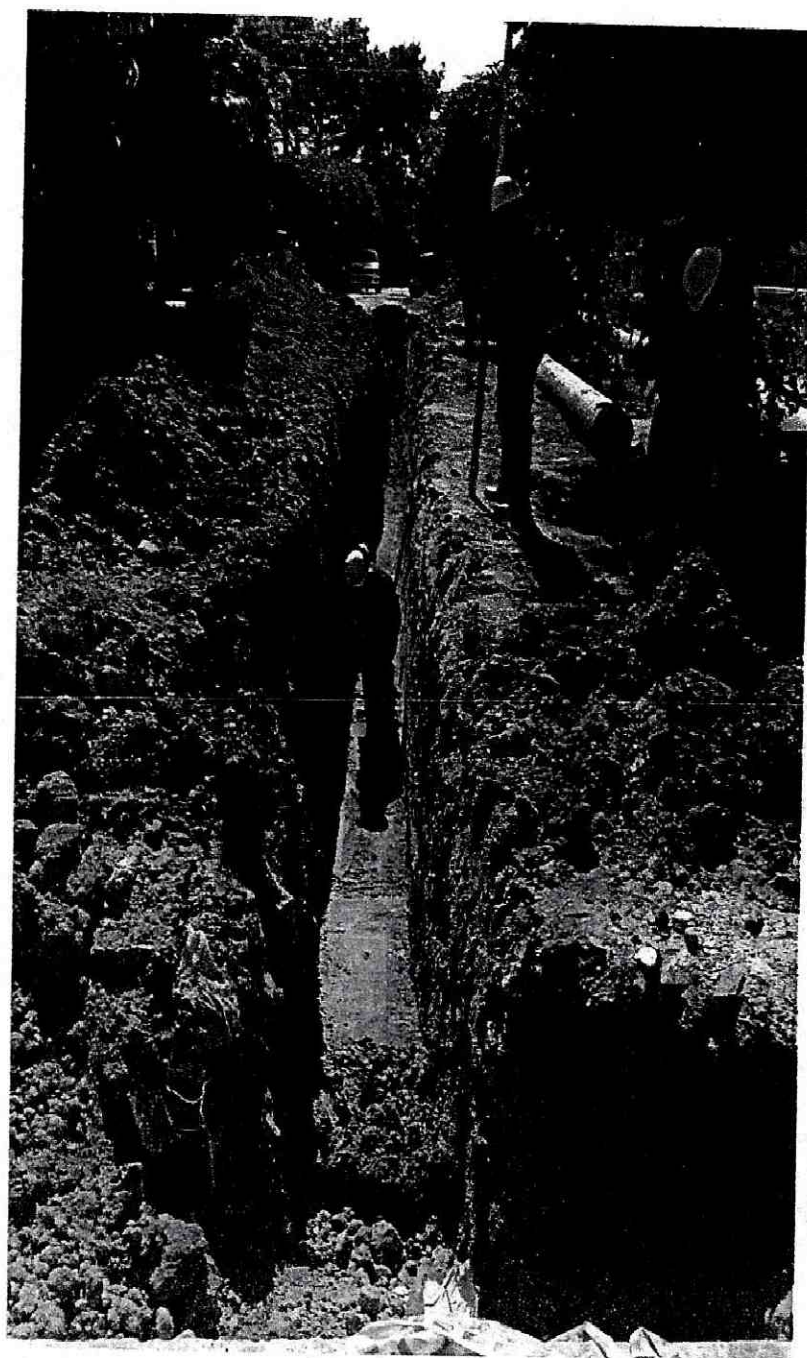


Colocación de solado para la instalación de la tubería

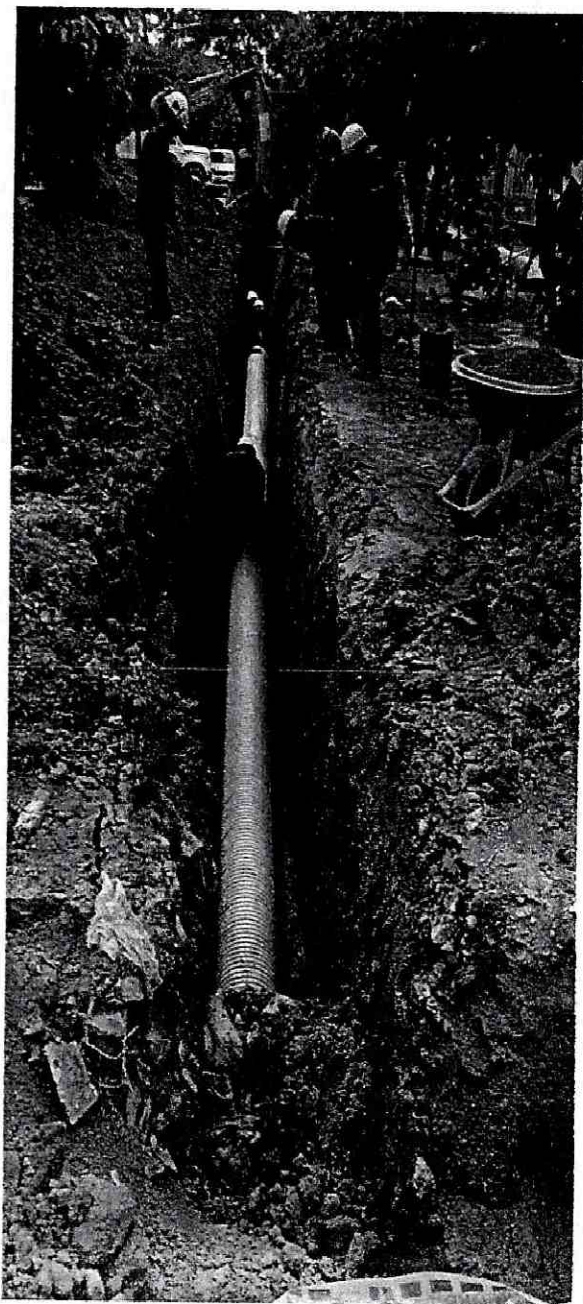

Instalación de tubería aguas lluvias



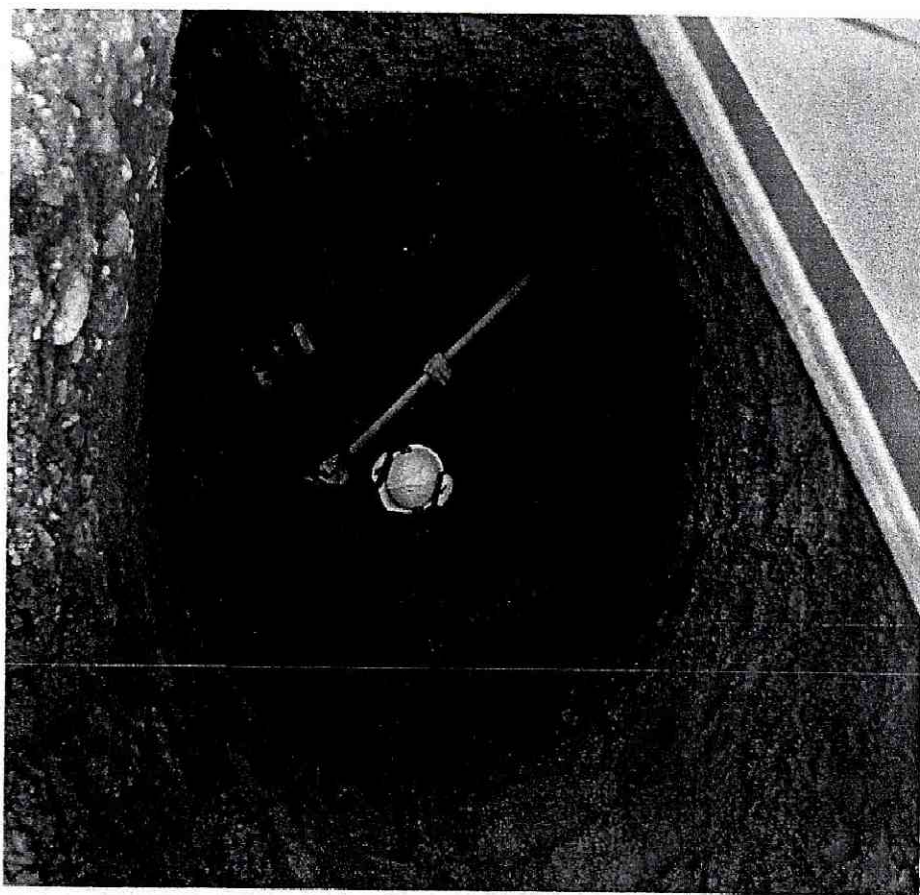

Excavación y construcción pozo de inspección

**CONTRATO No.: 0647-17**

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

**VALOR INICIAL:** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$224.783.860) IVA INCLUIDO

**FECHA DE INICIO:** 10 de Mayo de 2017

**PLAZO INICIAL:** 6 MESES

**% AVANCE EN TIEMPO:** 11.11 %

**% AVANCE FINANCIERO:** 0.00%

**FECHA TERMINACION:** 09 de Noviembre de 2017

**COMUNAS:** 3, 4, 5, 6 Y 7

**ALCANCE DEL CONTRATO:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra No 0646-17.

**PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA:** Socialización del proyecto en el barrio los Mandarinos, revisión y control de obra y calidad de las diferentes actividades que se ejecutan por parte del contrato de obra No 0646-17. Actas de inicio.
