

Contenido

INTRODUCCIÓN	8
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial	9
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica	9
Meta producto: Garantizar el servicio de agua potable a la comunidad del Centro poblado El Llanito, durante el cuatrienio.	9
Proyecto: Bpim: 20170680810022 Estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado del corregimiento El Llanito del municipio de Barrancabermeja.	9
CONTRATO No.: 1486-17	9
EVIDENCIAS:	11
Meta Producto: Rehabilitar 1.000 ml de redes de alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio.	11
Proyecto: Bpim 20160680810032 Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario del municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente	12
Meta Producto: Construir 500 metros lineales de nuevas redes de alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio.	12
Meta Producto: Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y rehabilitar 500 ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio.	12
Proyecto: Bpim: 20160680810031 Construcción alcantarillado pluvial del municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente.	12
CONTRATO No.: 0646-17	12
Proyecto: Bpim: 20160680810027 Construcción alcantarillado sanitario del municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente.	13
CONTRATO INTERVENTORIA No.: 0647-17	14
Meta de Producto: Optimizar 9 mini-PTAR existentes, durante el cuatrienio.	15
Proyecto: Bpim 20120680810147: Adecuación miniptars del municipio de Barrancabermeja Santander.	15
CONTRATO No.: 083-16	16
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 084-16	18
Meta Producto: Operar y mantener el 100% de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales rurales, durante el cuatrienio.	19



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



Proyecto: Bpim: 20170680810009 Adecuación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales rurales del municipio de Barrancabermeja.	19
CONTRATO No.: 1509-17	19
CONTRATO INTERVENTORIA No.: 1538-17	20
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial	21
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica	21
Meta Producto: Apoyar técnica y profesionalmente el desarrollo de procesos de planeación, contratación, evaluación y seguimiento a programas y proyectos del sector de infraestructura, durante el cuatrienio.....	22
Pilar: Seguridad Humana.....	23
Línea estratégica: Desarrollo Territorial.....	23
Programa: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.....	23
Meta de Producto: Realizar la construcción y/o mantenimiento de un 1 kilómetro de andenes teniendo en cuenta las necesidades de la población en situación en discapacidad durante el cuatrienio.	23
Proyecto: Bpim 20170680810024: Construcción de rampas y superficie táctil para la accesibilidad de personas con limitaciones física en el municipio Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente)	23
Contrato de Obra: No. 1530-17	23
Evidencias.....	24
LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.....	24
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.....	24
META PRODUCTO: RECUPERAR DOS PARQUES Y/O ESCENARIOS PÚBLICOS DURANTE EL CUATRIENIO.	24
No CONTRATO: 1053-15	24
No CONTRATO: 1054-15	26
PROGRAMA: Infraestructura Pública.....	28
Meta Producto: RECUPERAR DOS PARQUES Y O ESCENARIOS PÚBLICOS DURANTE EL CUATRIENIO	28
Proyecto: # bpin y/o Bpim 20140680810039: MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER.....	29
Contrato de Obra: No. 1078-2015	29
Meta Producto: Recuperar Dos Parques Y O Escenarios Públicos Durante El Cuatrienio.....	31



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



Proyecto: # bpim y/o Bpim 20150680810022:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BLANCA DURAN DE PADILLA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	31
Contrato de Obra:	No. 2006-2015	31
PILAR:	SEGURIDAD HUMANA.....	33
LÍNEA ESTRATÉGICA:	DESARROLLO TERRITORIAL	33
PROGRAMA O PLAN:	ARTICULACION INFRAESTRUCTURA VIAL.....	33
Meta producto:	Realizar Mantenimiento y/o Rehabilitación de 25 km de Malla Vial . 33 Rural	33
LINEA ESTRATEGICA:	DESARROLLO TERRITORIAL	33
PROGRAMA:	DESARROLLO DEL TERRITORIO	33
Meta Producto:	“CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O MANTENER 500 ML DE ACERAS Y/O SEPARADORES EN EL TERRITORIO URBANO Y RURAL DURANTE EL CUATRENIO”	34
No. CONTRATO:	1672-15	34
No CONTRATO:	1675-15	36
PROGRAMA:	DESARROLLO DEL TERRITORIO	37
META PRODUCTO:	Realizar el mantenimiento al cementerio público municipal, durante el cuatrienio.	38
Evidencias:	38
PILAR:	SEGURIDAD HUMANA.....	39
PROGRAMA:	Desarrollo del Territorio.....	39
Meta producto:	Remodelar y modernizar 2 parques del municipio de Barrancabermeja.	39
Proyecto: # Bpin 2015004680019:	Aunar Esfuerzos Entre El Departamento De Santander- Secretaria De Infraestructura Y El Municipio De Barrancabermeja - Secretaria De Infraestructura, Para La Remodelacion E Incorporacion De Nuevas Atracciones Acuaticas Parque Recreacional, Inderba, Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente)	39
Evidencias:	40
PILAR:	SEGURIDAD HUMANA	41
Línea estratégica:	Desarrollo Territorial.....	41
Programa:	Articulación de Infraestructura Vial	41
Meta de Producto:	Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5 kilómetros de la malla vial urbana, durante el cuatrienio.	41
Proyecto: # bpim y/o Bpim 20150680810023:	“Construcción y rehabilitación de vía y andenes en la carrera 24 entre calles 74 y 76a del municipio de Barrancabermeja, Santander Centro Oriente” ..	41



Alcaldía de
Barrancabermeja



Contrato de Obra: No. 2081-15.....	41
Evidencias: Registro Fotográfico	42
PILAR: SEGURIDAD HUMANA	43
Línea estratégica: Desarrollo Territorial	43
Programa: Articulación de Infraestructura Vial	43
Meta de Producto: Pavimentar y/o Mejorar 4 kilómetros de vías durante el cuatrienio.....	43
Proyecto: Bpin 2016680810003.	44
Contrato de Obra: No. 0605-17	44
Evidencias.....	45
Pilar: Seguridad Humana.....	51
Línea estratégica: Desarrollo Territorial.....	51
Programa: Articulación de Infraestructura Vial	51
Meta de Producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 25 kilómetros de la malla vial rural, durante el cuatrienio.	51
Evidencias:.....	52
Programa: Articulación de Infraestructura Vial	54
Meta producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5 kilómetros de la malla vial urbana, durante el cuatrienio.	54
EVIDENCIAS	55
Pilar: Seguridad Humana.....	56
Línea estratégica: Desarrollo Territorial.....	56
Programa: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.....	56
Contrato de Obra: No. 1530-17.....	57
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.....	58
PROGRAMA: ARTICULACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL	58
Contrato de Obra: No. 0432-2017	59
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.....	61
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL	61
PROGRAMA: ARTICULACION INFRAESTRUCTURA VIAL.....	61
Meta Producto: Realizar Mantenimiento y/o Rehabilitación de 25 km de Malla Vial Rural	61
Meta Producto Realizar Mantenimiento y/o Rehabilitación de 5Km de Malla Vial Urbana.....	61



Alcaldía de
Barrancabermeja



SECRETARÍA DE GOBIERNO	67
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.....	67
Línea estratégica: Desarrollo Territorial.....	67
Programa: 5.1.5.3 Fortalecimiento Institucional por la Seguridad si es posible	67
Meta de Producto: Mantener el Apoyo a los 5 organismos de Seguridad y convivencia de conformidad al Acuerdo 020 del 2011 durante el cuatrenio.....	67
Proyecto: 20140680810040 CONSTRUCCIÓN ESCUELA Y SEDE DE LA DEFENSA CIVIL BARRANCABERMEJA	69
Contrato de Obra No. 2085 del 2015	69
Contrato de Interventoría No. 1259 del 2016.....	69
Evidencias:.....	70
Pilar: Seguridad Humana.....	73
Línea estratégica: BARRANCABERMEJA SEGURA	73
Meta de Producto: Mantener el apoyo durante el cuatrienio a cinco organismo de seguridad según la ley 1421 del 2010-fonset de acuerdo plan integral de seguridad y convivencia ciudadana durante el cuatrienio.....	73
Proyecto: Bpim 20160680810045: Apoyo a organismo de seguridad según ley 1421 de 2010-FONSET en el municipio de Barrancabermeja.	73
Evidencias. Registro fotos:	75
Pilar: Seguridad Humana.....	75
Línea estratégica: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE.	75
Programa: LÍNEA ESTRATÉGICA BARRANCABERMEJA SEGURA	75
Meta de Producto: Mantener el apoyo durante el cuatrienio, a cinco (5) organismos de seguridad y convivencia de conformidad al acuerdo 020 de 2011 durante el cuatrenio.....	75
Proyecto: #20120680810131: APOYO AL FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES- FONSET-LEY 1421 DE 2010 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	76
Contrato de Obra: No. 2073-16.....	76
Evidencias:.....	77
PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional por la Seguridad SI ES POSIBLE	78
Meta Producto: Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de seguridad y convivencia, de conformidad al acuerdo 020 de 2011 durante el cuatrenio.	79



Alcaldía de
Barrancabermeja



Pilar: Cultura Ciudadana.....	80
Línea estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso	80
Programa: Mantener cobertura y permanencia en el sistema educativo	80
Meta de Producto: Adecuar y/o Remodelar la infraestructura de tres instituciones educativas dentro del cuatrienio.	80
Proyecto: 20150680810039 AMPLIACIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRAS CIVILES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD JOSE PRUDENCIO PADILLA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	81
Contrato de Obra No. 1251 del 2016	81
Contrato de Interventoría No. 1259 del 2016	81
Evidencias:	82
LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO ..	83
PROGRAMA: MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO	83
META PRODUCTO: ADECUAR Y/O REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO	84
CONTRATO: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGROPECUARIO LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, PRIMERA ETAPA, CENTRO ORIENTE”	85
Pilar: Seguridad Humana.....	86
Línea estratégica: Desarrollo Territorial.....	86
Programa: Mantener cobertura y permanencia en el sistema educativo	86
Meta de Producto: Adecuar y remodelar la infraestructura de tres (3) instituciones educativas	86
Proyecto: # BPIN 2015680810008: Mejoramiento de las instalaciones físicas institución educativa el Castillo Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente)	86
Contrato de Obra: No. 2123-16.....	86
Contrato de Interventoría No. 2067-16	87
Evidencias:	87
LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO	89
PROGRAMA: MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.....	89
META PRODUCTO: Adecuar y/o remodelar la infraestructura para la atención en educación inicial en 4 sedes educativas del sector urbano durante el cuatrienio.....	89



Alcaldía de
Barrancabermeja



PROYECTO: 20120680810041 CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.....	89
EVIDENCIAS	90
Pilar: Seguridad Humana.....	91
LINEA ESTRATEGICA: DEPORTE Y RECREACION	91
Programa: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	91
Meta de Producto: Realizar cuatro (4) adecuaciones, mejoramientos y/o conservaciones de escenarios deportivos del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio	91
Proyecto: #20120680810037: RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	91
Contrato de Obra: No. 1719-15.....	91
Evidencias:.....	93



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 136 de 1994, en su artículo 32 y en el Reglamento interno del Concejo Municipal de Barrancabermeja, se presenta este informe de Gestión correspondiente al periodo que comprende los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2016.

La Misión de la Secretaría de Infraestructura se enfatiza en “garantizar la oferta eficiente de la infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la competitividad local, garantizando la preservación de los recursos naturales, el patrimonio y el espacio público, la mayor cobertura social y de usuarios y las proyecciones de desarrollo y crecimiento poblacional, mediante una gestión articulada con el Banco de Proyectos Municipal y orientada a dirigir, supervisar y controlar los convenios y la contratación que se determine para adelantar los estudios, diseños, la ejecución e interventoría de las obras”

Su función primordial es la de “Diseñar y coordinar las diferentes políticas, programas, proyectos y actividades orientadas a la construcción y mantenimiento de la red vial, edificios públicos, servicios públicos, puentes, parques, entre otros, del municipio de Barrancabermeja”

Nuestro deseo es brindar la información necesaria que permita definir la gestión realizada y la situación actual del ejercicio, manifestamos nuestra total disposición de colaboración para continuar con la realización de las obras en beneficio de las comunidades de Barrancabermeja.

Seguidamente enunciaremos las metas a las cuales se les ha apuntado durante estos cinco meses aumentado así el indicador requerido en el Plan de Desarrollo “Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva” 2016-2019”.

Es primordial para este informe que el Honorable Concejo Municipal tenga en cuenta que dentro de nuestras funciones se encuentra la ejecución de obras por construcción, lo que no pueden realizar otras dependencias, es por ello que hemos apuntado principalmente a cubrir las necesidades que en materia de construcción tienen la SECRETARIA DE EDUCACION, LA SECRETARIA DE GOBIERNO, INDERBA, SECRETARIA GENERAL, por lo que podrán apreciar multiplica las tareas de esta dependencia.

De acuerdo con la estructura directriz del Honorable Concejo Municipal se construyó este con el orden del PLAN DE DESARROLLO donde cada meta contiene su objetivo, su meta propuesta, avance de cada contrato, población beneficiada con cada uno de ellos y empleabilidad.



Alcaldía de
Barrancabermeja



PILAR: SEGURIDAD HUMANA

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica

Meta producto: Garantizar el servicio de agua potable a la comunidad del Centro poblado El Llanito, durante el cuatrienio.

Proyecto: Bpim: 20170680810022 Estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado del corregimiento El Llanito del municipio de Barrancabermeja.

Meta programada vigencia 2017: 0.33

Ejecutado: 0.05

CONTRATO No.: 1486-17

Objeto: Realizar los estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado del corregimiento el Llanito del municipio de Barrancabermeja.

Valor inicial: Doscientos cincuenta y seis millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos pesos m/cte. (\$256.992.400) IVA incluido.

% de avance físico: 10.00 %

% avance en tiempo: 25.00 %

% avance financiero: 00.00%

Fecha de inicio: 25 de Agosto de 2017

Plazo inicial: 4 meses

Corregimiento: El Llanito



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



Alcance del contrato:

El proyecto consiste en la realización de los estudios y diseños para el proyecto de construcción del acueducto del centro poblado del corregimiento El Llanito, el cual debe incluir entre otros aspectos los siguientes:

- Descripción general de la problemática del corregimiento referenciado.
- Marco general de diseño del proyecto.
- Localización general del proyecto.
- Actualización del Censo de la población afectada incluida la georreferenciación de usuarios.
- Diagnóstico del sistema actual de acueducto del corregimiento referenciado.
- Resumen técnico del estado actual del sistema existente de Acueducto Vereda! de la referencia.
- Estudio de suelos y geotécnico de los predios donde se desarrollaran obras de infraestructura.
- Diseño de Red de Conducción (Incluye Tanques y/o sistema de bombeo, sistemas de válvulas y demás)
- Diseño de Redes Distribución del corregimiento de la referencia.
- Diseño de las redes de acueducto por medio de software computacional.
- Diseño de obras complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.
- Planos de ingeniería detallada de todos los componentes diseñados, debidamente firmados y diligenciados (Incluido Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas).
- Estudios y planos topográficos del área de estudio en Altimetría y Planimetría.
- Catastro de redes (Acueducto y Alcantarillado)
- Definir la relación costo/beneficio de la alternativa definitiva como solución con sus respectivas justificaciones y presupuestos.
- El proyecto debe presentarse bajo la metodología general aplicada MGA, junto con todos los soportes requeridos para el efecto (concesiones de agua, servidumbres, certificados de libertad y tradición, resolución de aprobación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, permisos de vertimientos, certificados municipales, etc., en los cuales sean de aplicación).
- Viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. (Artículo 87 de la ley 1474 de 2011).



Alcaldía de
Barrancabermeja



Realizaciones:

- Socialización con la comunidad
- topografía,
- trabajo de campo y elaboración de informe del centro poblado,
- censo de usuarios, definido el formato de recolección de información,
- recolección en campo de información y elaboración de información; el catastro identificación de redes actuales
- verificación de redes y elaboración de informe.

Población Beneficiada: 1500 habitantes

Impactos:

- Disminución de los índices de morbilidad en la población.
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
- Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos generados contrato de obra:

- Directos: 8
- Indirectos: 7

EVIDENCIAS:



Imagen del levantamiento topográfico realizado

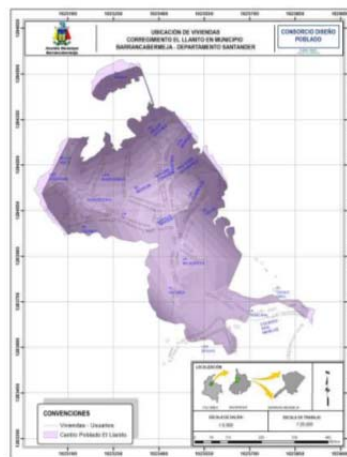


Imagen de la localización de las viviendas

Meta Producto: Rehabilitar 1.000 ml de redes de alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio.



Alcaldía de
Barrancabermeja



Meta programada vigencia 2017: 50

Ejecutado: 186.71 metros

Proyecto: Bpim **20160680810032** Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario del municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente

Meta Producto: Construir 500 metros lineales de nuevas redes de alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio.

Meta programada vigencia 2017: 25

Ejecutado: 757.50 metros

Meta Producto: Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y rehabilitar 500 ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio.

Meta programada vigencia 2017: 50 metros

Ejecutado: 212.47 metros

Proyecto: Bpim: **20160680810031** Construcción alcantarillado pluvial del municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente.

CONTRATO No.: 0646-17

Objeto: "Construcción y rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el municipio de Barrancabermeja"

Valor inicial: Tres mil doscientos catorce millones once mil doscientos treinta y tres pesos m/cte. (\$3.214.011.233,00).

Fecha de inicio: 10 de Mayo de 2017

Plazo inicial: 6 meses

% de avance físico: 42.00 %

% avance en tiempo: 67.00 %

% avance financiero: 42.00 %

Fecha terminación: 09 de Noviembre de 2017

Comunas: 1, 3, 4 y 7



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



Proyecto: Bpim: 20160680810027 Construcción alcantarillado sanitario del municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente.

Alcance del contrato: El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de tramos de alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios beneficiados en las comunas 3, 4, 5, 6 y 7 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja

Principales actividades realizadas a la fecha:

Socialización del alcance de los trabajos con las comunidades beneficiadas con el proyecto como son barrio Los Mandarinos, Belén, La Paz, Inscredial y Nuevo Horizonte donde ya se ha realizado las actas de vecindad, replanteos, excavaciones, demolición de pavimento, instalación de tubería de aguas lluvias y sanitarias y construcción de pozos de inspección, domiciliarias y sumideros.

Población afectada: 173.424 habitantes

Impactos:

- La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
- Disminución de los índices de morbilidad en la población.
- Disminución de costos por programas de descontaminación.
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
- Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos generados contrato de obra:

- Directos: 10
- Indirectos: 41



Excavación y colocación solado para la instalación de tubería

Instalación tubería sanitaria



Construcción sumidero



Construcción pozo de inspección



Colocación de solado para la instalación de la tubería



Instalación de tubería para aguas lluvias

CONTRATO INTERVENTORIA No.: 0647-17

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el municipio de Barrancabermeja

Valor inicial: Doscientos veinticuatro millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte. (\$224.783.860) IVA incluido

Fecha de inicio: 10 de Mayo de 2017

Plazo inicial: 6 MESES

% avance en tiempo: 67.00 %

% avance financiero: 42.00 %

Fecha terminación: 09 de Noviembre de 2017

Comunas: 3, 4, 5, 6 Y 7

Alcance del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra No 0646-17.



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



Principales actividades realizadas a la fecha: Socialización del proyecto en el barrio los Mandarinos, revisión y control de obra y calidad de las diferentes actividades que se ejecutan por parte del contrato de obra No 0646-17. Actas de inicio, informes, actas parciales de obra (2).

Meta de Producto: Optimizar 9 mini-PTAR existentes, durante el cuatrienio.

Meta Programada Vigencia 2017: Optimizar 2 mini-PTAR

Ejecutado: 0 (El convenio firmo el 31 de diciembre de 2015, con el cual se está realizando la adecuación de 9 miniptars)

Proyecto: Bpim **20120680810147:** Adecuación miniptars del municipio de Barrancabermeja Santander.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: 1-0016-2015

Objeto: Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto “adecuación de las miniptars del municipio de Barrancabermeja” aportantes Cormagdalena, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P, municipio de Barrancabermeja.

Valor del convenio: diez mil setecientos veinticuatro millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos trece pesos m/cte. (\$ 10.724'662.413,00).

Valor aporte Cormagdalena: Siete mil quinientos millones de pesos (\$ 7.500.000.000)

Valor aporte aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P: Doscientos noventa y seis millones setecientos noventa y seis mil cuarenta y siete pesos m/cte. (\$ 296.796.047)

Valor aporte municipio de Barrancabermeja: Dos mil novecientos veintisiete millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte. (\$2.927.866.366).

Fecha acta de inicio: 12 de mayo de 2016

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2017

Observación: El ejecutor del convenio y contratante es la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. El contratista de la obra es la empresa SERVICIVIL LTDA Contrato de Obra Pública N° 083 del 5 de mayo de 2016 y la interventoría es la empresa INGAP LTDA, contrato de Interventoría N° 084 del 5 de mayo de 2016. Las obras civiles empiezan el día 01 de junio de 2016.



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



CONTRATO No.: 083-16

Objeto: Adecuación, operación y mantenimiento de las miniptars del municipio de Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1-0016-2015

Valor inicial: Siete mil doscientos treinta y un millones quinientos sesenta y seis mil trescientos catorce pesos (\$ 7.231.566.314.00) m/cte.

Valor Adicional: Dos mil novecientos veintisiete millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos (\$2.927 .866.366) m/cte.

Valor Total: Diez mil ciento cincuenta y nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos ochenta pesos (\$ 10.159.432.680) m/cte.

% de avance físico: 90.00 %

% avance en tiempo: 87.00 %

% avance financiero: 93.00%

Fecha de inicio: 12 de Mayo de 2016

Plazo inicial: 12 meses

Plazo adicional: 3 meses

Plazo total: 15 meses

Acta de suspensión No. 01: 10 de Febrero de 2017

Acta prorroga 1 suspensión No. 01: 07 de Abril de 2017

Acta prorroga 2 a la suspensión No. 01: 10 de Mayo de 2017

Acta de reinicio No. 01: 31 de Mayo de 2017

Acta de adición en valor: 2 de Junio de 2017

Acta de adición en plazo: 16 de Junio de 2017

Comunas: 4 Y 7

Alcance del contrato: El proyecto consiste en la adecuación, puesta en marcha y operación y mantenimiento de nueve (9) miniptars ubicadas en los barrios Almendros, Bosques de la Cira, altos de Cañaveral, altos del Cincuentenario, Asoprados, Cincuentenario VII etapa, Marsella y Naranjos de la comuna 4 y el barrio Nuevo Horizonte de la comuna 7 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



En el periodo comprendido en este informe se han realizado actividades en las diferentes plantas como son: la construcción de obras de estabilización y protección de estructuras, tramite de legalización ante la ESSA, instalaciones eléctricas, montaje de equipos y puesta en marcha de las miniptars entre otras.

Población afectada: 173.424 habitantes

Impactos:

- La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
- Disminución de los índices de morbilidad en la población.
- Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.
- Disminución de costos por programas de descontaminación.
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
- Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos generados contrato de obra:

- Directos: 18
- Indirectos: 56



Puesta en marcha miniptar



Vertedero de aforo entrada miniptar

Obras de estabilización y cerramiento miniptar



Pasarela y lecho de secado de lodos

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 084-16

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la adecuación de las miniptars del municipio de Barrancabermeja – Convenio interadministrativo 1-0016-2015

Valor inicial: Quinientos cincuenta y nueve millones seiscientos dieciocho mil ciento cuarenta y cinco pesos (\$ 559.618.145.00) m/cte.

% avance en tiempo: 100.00 %

% avance financiero: 100.00 %

Fecha de inicio: 12 de Mayo de 2016

Plazo inicial: 12 MESES



Alcaldía de
Barrancabermeja



Acta de suspensión No. 01: 10 de Febrero de 2017
Acta prorroga 1 suspensión No. 01: 07 de Abril de 2017
Acta prorroga 2 a la suspensión No. 01: 10 de Mayo de 2017
Acta de reinicio No. 01: 31 de Mayo de 2017
Fecha de terminación: 30 de Agosto de 2017

Comunas: 4 Y 7

Alcance del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra No 083-16.

Principales actividades realizadas a la fecha: Revisión y control de obra y calidad de las diferentes actividades que se ejecutan por parte del contrato de obra No 083-16. Las funciones de la interventoría las continua realizando el personal designado para estas actividades pertenecientes a la empresa Aguas de Barrancabermeja S. A. E.S.P.

Meta Producto: Operar y mantener el 100% de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales rurales, durante el cuatrienio.

Proyecto: Bpim: **20170680810009** Adecuación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales rurales del municipio de Barrancabermeja.

CONTRATO No.: 1509-17

Objeto: Adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de Plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales y Rehabilitación de redes de alcantarillado en el área rural del municipio de Barrancabermeja.

Valor inicial: Mil doscientos noventa y seis millones Seiscientos veinticinco mil ciento cincuenta y tres. Pesos con noventa y cinco centavos M/cte. (\$ 1.296.625.153,95) m/cte.

% de avance físico: 10.00 %
% avance en tiempo: 20.00 %
% avance financiero: 30.00%
Fecha de inicio: 22 de Agosto de 2017
Plazo inicial: 5 meses

Corregimientos: San Rafael de Chucuri, El Centro, El Llanito

Meta plan de desarrollo: Adecuar el 20% de las plantas de tratamiento de aguas residuales rurales existentes, durante el cuatrienio.

CONTRATO INTERVENTORIA No.: 1538-17

Objeto: Interventoría para la Adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de Plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales y Rehabilitación de redes de alcantarillado en el área rural del municipio de Barrancabermeja.

Valor inicial: Ciento veintinueve millones seiscientos ochenta y Seis mil doscientos pesos m/cte. (\$129.686.200 00) m/cte.

% de avance físico: 10.00 %

% avance en tiempo: 20.00 %

% avance financiero: 00.00%

Fecha de inicio: 22 de Agosto de 2017

Plazo inicial: 5 meses

Alcance del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra No 1509-17.

Principales actividades realizadas a la fecha: Socialización del proyecto en los centros poblados, revisión de los sistemas de acueducto y alcantarillado que van a ser intervenidos, definir actividades a realizar en cada uno de ellos.

Meta programada vigencia 2017: 0.1

Ejecutado: 0

Alcance del contrato: El proyecto consiste en la adecuación, puesta en marcha y operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable y plantas de aguas residuales, y rehabilitación de redes de alcantarillado en el área rural del municipio de Barrancabermeja, como son los centros poblados de San Rafael de Chucuri, El Llanito y El Centro en la vereda Los laureles

En el periodo comprendido en este informe se han realizado actividades en los diferentes sitios, determinando las necesidades, realizando las socializaciones con las diferentes comunidades, afiliaciones de personal, compra de equipos y materiales.

Población afectada: 4500 habitantes



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



Impactos:

- La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
- Disminución de los índices de morbilidad en la población.
- Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.
- Disminución de costos por programas de descontaminación.
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
- Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos generados contrato de obra:

- Directos: 6
- Indirectos: 15

Programa:

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica



Alcaldía de
Barrancabermeja



Meta Producto: Apoyar técnica y profesionalmente el desarrollo de procesos de planeación, contratación, evaluación y seguimiento a programas y proyectos del sector de infraestructura, durante el cuatrienio.

NOMBRE	OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR	CONCEPTO DEL RUBRO	NUMERO DE CONTRATO
ANGELICA MARIA MARTINEZ ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA APOYAR ACOMPAÑAR Y BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 20.800.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1932-17
MAGDA JOHANNA ORDUZ LAMUS	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO CON MAGISTER PARA APOYAR EN LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 18.000.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1933-17
JESSIE STIVENT MORENO SALOM	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 16.800.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1905-17
YESENIA GALVIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR APOYO EN LOS TRÁMITES FINANCIEROS, ASÍ COMO EFECTUAR CONCEPTOS Y BRINDAR EVALUACIONES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DESARROLLADOS POR LA DEPENDENCIA.	4 MESES	\$ 14.000.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1913-17
LILIBETH GUERRERO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR TECNICAMENTE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y DEMAS OBRAS CIVILES ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	3 MESES Y 18 DIAS	\$ 14.040.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	2048-17
PAOLA BASTO MORENO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL BRINDANDO APOYO Y ASESORIA A LA GESTION DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS QUE SE ADELANTE DESDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 15.200.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1683-17
ERICH ZAMIR GOMEZ VASQUEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO TAMBIEN PRESTAR APOYO CON EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS ACCIONES DE TUTELA EN DONDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUEDA SER PARTE Y DERECHOS DE PETICION INTERPUESTAS ANTE LA MISMA.	4 MESES	\$ 13.200.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1643-17
DIEGO ANDRES JIMENEZ ROA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EN LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LOS ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES PARA APOYAR EN LOS ASPECTOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 14.000.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1639-17
LAURA VANESSA RANGEL ACOSTA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	4 MESES	\$ 15.200.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1905-17
ANGELA PATRICIA ALDANA ARDILA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS PROYECTOS Y/O PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 13.200.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1636-17
LINA VANESSA SANABRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 13.200.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1640-17
GERSON VEGA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, ; ASÍ COMO APOYAR EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE LA DEPENDENCIA.	3 MESES Y 8 DIAS	\$ 18.513.600,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	2137-17
DANIEL ENRIQUE CAÑAS GRANADOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO COAYUDANDO EN LA PROYECCION DE INFORME Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	3 MESES	\$ 7.800.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1637-17
LEYDI CELINA NUÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES PARA APOYAR EN LOS ASPECTOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 16.000.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1630-17
DANIEL CAMILO PRADA MILLAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTRES PARA APOYAR EN LOS ASPECTOS TECNICOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 15.200.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1632-17
JENNIFER MAYORGA REYES	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	4 MESES	\$ 13.200.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1795-17
SANDRA ESTELLA CALLEJAS ALVARADO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN LA DIFERENTES ETAPAS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	3 MESES	\$ 9.900.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	
YANINA LUCILA ELLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ASESORAR Y APOYAR CON EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS TUTELAS INTERPUESTAS CONTRA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AQUELLAS DONDE PUEDA SER PARTE, ASÍ COMO TAMBIEN EN EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN PRESENTADOS ANTES LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	4 MESES	\$ 12.000.000,00	FORTALECIMIENTO A LA GESTION TECNICA Y PROFESIONAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO ORIENTE.	1665-17



**Alcaldía de
Barrancabermeja**

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Meta de Producto: Realizar la construcción y/o mantenimiento de un 1 kilómetro de andenes teniendo en cuenta las necesidades de la población en situación en discapacidad durante el cuatrienio.

Realizaciones:

El proyecto consiste en la construcción de andenes cumplimiento con la norma de urbanismo y rampa para persona con algún grado de discapacidad, inicialmente el proyecto nace para cumplir cinco acciones populares como el resultado de una sentencia judicial el cual se incluyeron cinco sitios como en el palacio de justicia, instalación de colpensiones antiguo movistar, centro del menor infractor, calle 48 con carrera 27 el recreo y calle 49 con carrera 18 hotel bachue I de los barrios beneficiados en las comunas 3, 4, 5, 6 y 7 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja, se ha socializado los alcances de las obras con las comunidades beneficiadas con el proyecto como son barrio el recreo, Colombia, buenos aires pueblo; donde ya se han realizado las actas de vecindad, replanteos, excavaciones, instalación de bordillos y fundida de concretos.

Proyecto: Bpim 20170680810024: Construcción de rampas y superficie táctil para la accesibilidad de personas con limitaciones física en el municipio Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente)

Contrato de Obra: No. 1530-17

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN RAMPAS Y SUPERFICIES TÁCTIL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON LIMITACIONES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Avance Físico: 25.2%

Valor Total: \$407.505.873,00

Valor Programado contrato de Obra: \$ \$407.505.873

Valor Ejecutado contrato de obra: \$101.924.753,85



Alcaldía de
Barrancabermeja



Población Beneficiada del contrato de obra: toda la población con algún grado de discapacidad.

Impacto: mejor calidad de vida para la persona en discapacidad para un mejor acceso y comunidad al ingreso de un establecimiento público.

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: tres profesionales (arquitecto, ingeniero, hs)

Indirectos: nuevos personal para obra civil (obreros y maestro de obra)

Contrato de Interventoría: el contrato de obra No 1530-17 no tiene interventoría la realiza directamente la secretaria de infraestructura:

Evidencias



LINEA ESTRATEGICA:	DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
META PRODUCTO:	RECUPERAR DOS PARQUES Y/O ESCENARIOS PÚBLICOS DURANTE EL CUATRIENIO.
No CONTRATO:	1053-15
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA CON OBRAS DE REMODELACION Y ADECUACION URBANISTICA DEL POLIDEPORTIVO CENTRO CIVICO BARRIO GALAN (COTRAECO) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”
VALOR INICIAL:	SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$6.574.203.131)



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



VALOR ADICIONAL No.3: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$242.369.779,50)

VALOR ACTUAL: SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$6.816.572.910,50)

ACTA DE INICIO: JULIO 13 DE 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

ADICIONAL No. 1: UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL

SUSPENSIÓN No. 1: DOS (2) MESES Y TRES (03) DÍAS A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO DE 2016.

ADICIONAL No. 2: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2016.

SUSPENSIÓN No. 2: UN (1) MES A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2016.

PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 2: DIECISÉIS (16) DÍAS A PARTIR DEL 16 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 3: UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DE 2016

PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 3: DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PRORROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 3: UN (1) MES A PARTIR DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 4: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

REINICIO No. 4: 11 DE JULIO DE 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 DE JULIO DE 2017



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



% AVANCE TOTAL: 100%

COMUNA: 2

POBLACION BENEFICIADA: 173.424 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ALCANCE DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA CON OBRAS DE REMODELACION Y ADECUACION URBANISTICA DEL POLIDEPORTIVO CENTRO CIVICO BARRIO GALAN (COTRAECO).

ESTADO: ESPERANDO APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESSA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.



INTERVENTORIA

No CONTRATO: 1054-15

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA CON OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN URBANISTICA DEL POLIDEPORTIVO CENTRO CIVICO BARRIO GALAN (COTRAECO) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”

VALOR: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS (\$338.036.528,00)

ACTA DE INICIO: JULIO 13 DE 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



ADICIONAL No. 1: UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL

SUSPENSIÓN No. 1: DOS (2) MESES Y TRES (03) DÍAS A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO DE 2016.

ADICIONAL No. 2: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2016.

SUSPENSIÓN No. 2: UN (1) MES A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2016.

PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 2: DIECISÉIS (16) DÍAS A PARTIR DEL 16 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 3: UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DE 2016

PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 3: DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PRORROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 3: UN (1) MES A PARTIR DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUSPENSIÓN No. 4: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

REINICIO No. 4: 11 DE JULIO DE 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 DE JULIO DE 2017

% AVANCE TOTAL: 100%

COMUNA: 2

POBLACION BENEFICIADA: 173.424 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ALCANCE DEL CONTRATO: INTERVENTORIA

ESTADO: ESPERANDO APROBACIÓN POR PARTE DE LA ESSA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



PROGRAMA: Infraestructura Pública

Meta Producto: RECUPERAR DOS PARQUES Y O ESCENARIOS PÚBLICOS DURANTE EL CUATRENIO

REALIZACIONES:

Mantenimiento y remodelación de los escenarios deportivos en las canchas de futbol barrio Galán Gómez (Cotraeco), barrio Campin, barrio Cincuentenario y polideportiva barrio La Floresta.

Interviniendo campo de juego, graderías, camerinos y urbanismo, por medio de la ejecución de actividades de drenajes de aguas lluvias, construcción y/o adecuación de gradas y camerinos e instalación de cerramiento metálico y obras de urbanismo entre otras.

Los escenarios del barrio Galán Gómez (cancha de futbol Cotraeco), cancha de futbol barrio El Campin, Cincuentenario y polideportiva barrio La Floresta ya fueron finalizados.

El día 16 de diciembre de 2016 se legalizó el adicional 2 del contrato por un valor de \$5'197.505.486,00 y un plazo de 5 meses con el fin de incluir 3 nuevos escenarios deportivos:

Actualmente los 3 escenarios se encuentran en etapa de ejecución, presentado los siguientes avances:

Cancha de futbol barrio Primero de Mayo: Demolición y retiro de cerramiento existente, excavación y retiro de material existente de campo de juego, Construcción de graderías, adecuaciones de camerinos existentes, excavación y fundida de cimentación de muro de cerramiento, alzada de muro de cerramiento, prefabricación e instalación de cerramiento en perfilera tubular y lamina troquelada, instalación de filtros, construcción de urbanismo y graderías. (Pendiente conformación de arena de superficie de juego)

Estadio de Beisbol 26 de Abril: Demolición y retiro de cerramiento existente, adecuación de camerino, baños, dugout's, limpieza y recuperación de fachada, prefabricación e instalación de back stop y cerramiento en lamina troquelada, instalación de filtros, instalación de grama sintetica y construcción de montículos.

Cancha de Mini Futbol barrio Aguas Claras: Demolición y retiro de cerramiento existente, demolición de cárcamos existentes, construcción de graderías, excavación y fundida de cimentación de muro de cerramiento, alzada de muro de cerramiento, prefabricación e instalación de cerramiento en perfilera tubular y lamina troquelada, instalación de filtros, construcción de urbanismo y graderías. (Pendiente conformación de arena de superficie de juego)



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



Proyecto: # bpin y/o Bpim 20140680810039: MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

Contrato de Obra: No. 1078-2015

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

Avance Físico: 95%

Valor Total: \$ 15.614.703.086

Valor Programado contrato de Obra: \$ 15.614.703.086

Valor Ejecutado contrato de obra: \$ 14.833.967.932

Población Beneficiada del contrato de obra: 191.616 DANE

Impacto:

- Genera bienestar en la población infantil de las zonas donde se construyen las canchas ya que pueden contar con juegos cerca a su hogar
- Lugar de entrenamiento para la población deportiva
- La población Adulta mayor encuentra lugar de descanso y entretenimiento.

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: 1

Indirectos: 70

Contrato de Interventoría No. 1146-15

Avance: 95%

Valor Programado: (\$497.911.255,00)

Valor Ejecutado: (\$473.015.692,00)

Empleos generados Interventoría:

Directos: 1

Indirectos: 10



Alcaldía de
Barrancabermeja

EVIDENCIAS



Cancha de minifutbol barrio Aguas Claras



Cancha de futbol barrio Primero de Mayo



Fachada estadio de beisbol 26 de Abril



Campo de juego estadio de beisbol 26 de Abril

Meta Producto: Recuperar Dos Parques Y O Escenarios Públicos Durante El Cuatrenio

REALIZACIONES

El proyecto consiste en la remodelación de la polideportiva Blanca Duran de Padilla, interviniendo las graderías, área de la polideportiva y aledaños, al igual que la plazoleta.

Adicionalmente se incluirán senderos peatonales, zonas verdes, juegos infantiles y gimnasios biosaludables.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA: Demolición y desmante de estructuras en concreto y metálicas pertenecientes a plazoleta, graderías y polideportiva, instalaciones hidrosanitarias, rellenos, construcción de muros de contención en gaviones y en concreto para graderías, construcción de graderías y rampas peatonales, construcción e instalación de cerramiento perimetral para polideportiva, urbanismo, construcción de materas en plazoleta, instalación de juegos para niños y gimnasios biosaludables.

Pendiente finalización de actividades estipuladas en el adicional, construcción de camerinos y estructura elevada para sendero peatonal.

Proyecto: # bpin y/o Bpim 20150680810022: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BLANCA DURAN DE PADILLA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Contrato de Obra: No. 2006-2015

Objeto del Contrato: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BLANCA DURAN DE PADILLA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Avance Físico: 80%

Valor Total: \$ 4.712.079.189

Valor Programado contrato de Obra: \$ 4.854.413.526

Valor Ejecutado contrato de obra: \$ 3.769.663.351

Población Beneficiada del contrato de obra: 3287 DANE

Impacto

- Genera bienestar en la población infantil de la comuna uno al contar con juegos cerca a su hogar
- Lugar de entrenamiento para la población deportiva

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: 1

Indirectos: 30

Contrato de Interventoría No. 0817-16

Avance: 80%

Valor Programado: (\$442.294.495,00)

Valor Ejecutado: (\$353.835.596,00)

Empleos generados Interventoría:

Directos: 1

Indirectos: 20



Panorámica del escenario

Gimnasios biosaludables



Zona de Juegos infantiles

Zona de juegos infantil

PILAR: SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA O PLAN: ARTICULACION INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta producto: Realizar Mantenimiento y/o Rehabilitación de 25 km de Malla Vial

Rural

Realizar Mantenimiento y/o Rehabilitación de 5Km de Malla Vial Urbana

OBJETO: Compra de insumos para el Mantenimiento de la maquinaria pesada para el mantenimiento mejoramiento y rehabilitación de la malla vial del Municipio de Barrancabermeja

% AVANCE TOTAL 53%

ESTADO En ejecución



LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO

Meta Producto: “CONSTRUIR, AMPLIAR Y/O MANTENER 500 ML DE ACERAS Y/O SEPARADORES EN EL TERRITORIO URBANO Y RURAL DURANTE EL CUATRENIO”

No. CONTRATO: 1672-15

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA FASE I (URBANISMO BORDE LA CIENAGA MIRAMAR Y PERFIL VIAL CALLE 52) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”

VALOR INICIAL: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTO SETENTA Y UN MIL MCTE (\$19.416.702.371,00)

VALOR ADICIONAL No.1: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MCTE (\$7.981.574.976)

VALOR ACTUAL: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$27.398.294.191,00)

ACTA DE INICIO: AGOSTO 20 DE 2015

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

PLAZO ADICIONAL No 1: CUATRO (4) MESES.

PLAZO ACTUAL: NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 19 DE ENERO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONAL No. 1: 19 DE MAYO DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 20 DE ENERO DE 2016

FECHA DE REINICIO No. 1: 14 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 22 DE JULIO DE 2016



Alcaldía de
Barrancabermeja

FECHA DE REINICIO No. 2: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016



FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3 21 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3: 02 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 3: 21 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE REINICIO No. 3: 12 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: 27 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 4: 25 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 4: 23 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 4: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

% DE AVANCE TOTAL: 99.95%

ESTADO: ESPERANDO LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ESSA LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE MEDIA TENSIÓN Y SUS OBRAS

POBLACION BENEFICIADA: 173.424 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ALCANCE DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA FASE I (URBANISMO BORDE LA CIENAGA MIRAMAR Y PERFIL VIAL CALLE 52) EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"



CICLOVIA MALECÓN

INTERVENTORIA

No CONTRATO: 1675-15

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION MALECON DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA FASE I (URBANISMO BORDE LA CIENAGA MIRAMAR Y PERFIL VIAL CALLE 52 EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”

VALOR INICIAL: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$844.618.504)

VALOR ADICIONAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$252.562.856)

VALOR ACTUAL: MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$ 1.097.181.360,00)

ACTA DE INICIO: AGOSTO 20 DE 2015

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES A APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

PLAZO ADICIONAL No.1: CUATRO (4) MESES

PLAZO ACTUAL: DIEZ (10) MESES



Alcaldía de
Barrancabermeja

FECHA TERMINACIÓN INICIAL:

19 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:

20 ENERO DE 2016

FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 1:

14 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:

22 DE JULIO DE 2016

FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 2

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:

09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE PRÓRROGA 1 DE SUSPENSIÓN No. 3:

21 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE PRÓRROGA 2 DE SUSPENSIÓN No. 3:

02 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 3:

12 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:

27 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE PRÓRROGA 1 DE SUSPENSIÓN No. 4:

25 DE ABRIL DE 2017

FECHA TERMINACIÓN DE PRÓRROGA No.1 DESUSPENSIÓN No.1:

24 DE JUNIO DE 2017

% AVANCE TOTAL:

99.95 %

POBLACION BENEFICIADA:

173.424 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

ALCANCE DEL CONTRATO: INTERVENTORIA

ESTADO:

A LA ESPERA DE LA LEGALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA ESSA DE LOS TRABAJOS DE
REEMPLAZO DE MEDIA TENSIÓN Y SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS.

PROGRAMA:

DESARROLLO DEL TERRITORIO



META PRODUCTO: Realizar el mantenimiento al cementerio público municipal durante el cuatrienio.

Cementerio

Alcaldía de
Barrancabermeja



Se realizó un trabajo de instalación de redes nuevas, se hicieron huecos para hincar postes, se les colocó muertos para realizar templete a los postes, se instalaron perchas, aisladores, se extendió y templo cable en todas las instalaciones se armaron e instalaron reflectores, se arreglaron los hongos existentes, se reparó la bomba de agua, se instaló controles para las lámparas, se energizó la garita y se cambió el cableado de la misma, con instalación de tomas, plafones, apagadores, se cambió caja de breakers, y borneras, posterior se presentó problemas con el transformador quemando nuevamente el alumbrado ante lo cual se repararon nuevamente, pendiente terminar trabajos en garita y se recomienda hacer reparación, cambio o mantenimiento de transformador.

Evidencias:



Cementerio Municipal



PILAR: SEGURIDAD HUMANA

PROGRAMA: Desarrollo del Territorio

**Alcaldía de
Barrancabermeja**

Meta producto: Remodelar y modernizar 2 parques del municipio de Barrancabermeja.



Realizaciones:

El proyecto contempla la incorporación de dos piscinas una de ellas con olas con una capacidad de ocupación de 500 bañistas simultáneos, la otra es una piscina de niños con una ocupación de 400 niños simultáneos, portería, módulo de administración, módulo de lookers, módulo de duchas, cuarto de primeros auxilios, parqueadero al público y circulaciones, la remodelación del parque recreacional y su inversión convierten sus instalaciones en una infraestructura competitiva frente a las necesidades turísticas que requiere el Municipio y sus posibilidades de crecimiento económico.

Proyecto: # Bpin 2015004680019: Aunar Esfuerzos Entre El Departamento De Santander- Secretaria De Infraestructura Y El Municipio De Barrancabermeja - Secretaria De Infraestructura, Para La Remodelacion E Incorporacion De Nuevas Atracciones Acuaticas Parque Recreacional, Inderba, Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente)

Convenio: No. No 1233-15 Rad gobernación

No 2362-16 Rad Municipio

Objeto del contrato: “aunar esfuerzos entre el departamento de Santander- secretaria de infraestructura y el municipio de Barrancabermeja - secretaria de infraestructura, para la remodelación e incorporación de nuevas atracciones acuáticas parque recreacional, inderba, Barrancabermeja”

Avance Físico: 40%

Valor Total: \$10.133.262.011

- GOBERNACION DE SANTANDER \$ 7.633.262.011
- MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA \$ 2.500.000.000

Valor Programado del convenio: \$1000.000.000

Valor Ejecutado del convenio: \$1000.000.000



Población Beneficiada: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Impacto:

**Alcaldía de
Barrancabermeja**

- Nuevas áreas recreativas para Barrancabermeja
- Mayor Integración de la familia.

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: (Actualmente suspendido)

Indirectos

Evidencias:



Construcción área piscina de olas



PILAR: SEGURIDAD HUMANA

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Articulación de Infraestructura Vial

Meta de Producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5 kilómetros de la malla vial urbana, durante el cuatrienio.

Realizaciones:

El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de dos tramos viales; entre las actividades principales son: construcción de alcantarillado pluvial y reposición de alcantarillado sanitario, construcción de obras de urbanismo y pavimentación en mezcla asfáltica en caliente, en los barrios beneficiados en las comunas 3 y 6 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja, en una longitud aproximada de 720 metros lineales.

Proyecto: # bpin y/o Bpim 20150680810023: “Construcción y rehabilitación de vía y andenes en la carrera 24 entre calles 74 y 76a del municipio de Barrancabermeja, Santander Centro Oriente”.

20150680810024: “Construcción y rehabilitación de vía y andenes Diagonal 59 entre transversal 47 y 45 del municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente”

Contrato de Obra: No. 2081-15

Objeto del Contrato: Construcción y rehabilitación de vía y andenes en la carrera 24 entre calles 74 y 76a; Diagonal 59 entre transversal 47 y 45 del municipio de Barrancabermeja.

Avance Físico: 70%

Valor Total: \$ 3.731.471.765

Valor Programado contrato de Obra: \$ 1.852.740.023

Valor Ejecutado contrato de obra: \$ 2.042.003.691



Población Beneficiada del contrato de obra: 14195 habitantes

Impacto: Aumento en la movilidad, fortalecimiento en la economía de

**Alcaldía de
Barrancabermeja**

Empleos generados contrato de Obra: 180 empleos



Contrato de Interventoría: No. 0603-17

Avance: 90%

Valor Programado: \$ 80.714.973

Valor Ejecutado: \$ 80.714.973

Empleos generados Interventoría: 5 empleos

Evidencias: Registro Fotográfico



CRA.24 CON CALLE 74



CRA.24 CON CALLE 76A



OFICINA DE AUTOPAVIMENTACION

PILAR: SEGURIDAD HUMANA

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Articulación de Infraestructura Vial

Meta de Producto: Pavimentar y/o Mejorar 4 kilómetros de vías durante el cuatrienio.

Realizaciones:

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 12 kilómetros de pavimento hidráulico de 3000 PSI, en 165 tramos viales localizados en las comunas 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7, en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja. Se ha socializado los alcances de las obras con las comunidades beneficiadas con el proyecto como son barrio San Francisco, Buenos Aires II, Olaya Herrera, Parnaso, Belén, Internacional, San Judas Tadeo, Cristo Rey, Caminos de San Silvestre, La Paz, Bosques de la Cira, Limonar, Buenavista, Cincuentenario, Cincuentenario VII Etapa, Palmar II, Mandarinos, Península, Ciudadela Cincuentenario, Pinos, Yarima, Los Lagos, Barrancabermeja, San Pedro Claver, Nuevo Milenio, Candelaria, Miraflores, Simón Bolívar, San Pedro, Brisas de Versalles, Benjamín Herrera, Brisas de San Martín, Antonio Nariño, Granjas, Alpes, 20 de Agosto, 20 de Julio, Corinto, Rafael Rangel, Altos del Campestre, Fundadores, Campestre, Prados del Campestre, Independencia, Villarelys II, Nuevo Horizonte, Nueve de Abril, 16 de Marzo y Minas del Paraíso. El proyecto se encuentra en el sexto mes de ejecución y a la fecha se han intervenido los tramos viales correspondientes a los barrios San Judas Tadeo, Caminos de San Silvestre, 20 de Agosto, Barrancabermeja y se está dando inicio a la intervención en los tramos viales de los barrios La Paz, Bosques de la Cira, Pinos, Yarima, Candelaria, y Villarelys II.



Proyecto: Bpin 2016680810003.

Contrato de Obra: No. 0605-17



**Alcaldía de
Barrancabermeja**

Objeto del Contrato: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS A REALIZAR POR AUTOPAVIMENTACION EN LAS COMUNAS DE BARRANCABERMEJA".

Avance Físico: 15.3%

Valor Total: \$20.649.114.650,75

Valor Programado contrato de Obra: \$18.839.362.650,75

Valor Ejecutado contrato de obra: \$2.267.458.925,36

Población Beneficiada del contrato de obra: 19880 habitantes

Impacto:

- Mejoramiento de la movilidad del sector.
- Mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del sector.
- Generación de empleo durante la ejecución de las obras, a través del aporte de la mano de obra no calificada aportada por la comunidad.
- Dinamiza la economía en general del Municipio.

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: 33

Indirectos: 40

Contrato de Interventoría: No. 0608-17

Avance: 12.04%

Valor Programado: \$1.809.752.000,00

Valor Ejecutado: \$1.809.752.000,00

Empleos generados Interventoría:

Directos: 8

Indirectos: 0



Alcaldía de
Barrancabermeja
COMPUNA 3

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



SAN JUDAS TADEO, Calle 74B con Carrera 34A al fondo, canalización



SAN JUDAS TADEO, Calle 73ª entre carreras 34B y fondo.





Alcalde
Barranc

CAMINOS DE SAN SILVESTRE, Calle 80 entre carreras 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.

BARRANCABERMEJA
POSIBLE
ESTRUCTURA



CAMINOS DE SAN SILVESTRE, 027 Carrera 40 entre calles 81, 80, 79 y 78 bajos.



CAMINOS DE SAN SILVESTRE, Carrera 41 entre calles 81, 80, 79 y 78 bajos.



BARRANQUILLA
MEJORA
VIA
ESTRUCTURA

CAMINOS DE SAN SILVESTRE, Carrera 42 entre calles 81, 80, 79 y 78 bajos.



LA PAZ, Calle 75C entre puente y las carreras 37ª, 37B, 37C, 37D y 37E

COMUNA 4

BOSQUE DE LA CIRA, Carrera 38 con calle 37 vía principal al fondo (Iniciando Pavimento)





PINOS, Carrera 36 entre calles 34, 33, 32ª al fondo. (Iniciando Pavimento)

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
ESTRUCTURA

Alcalde
Barrancabermeja



YARIMA, Carrera 36A entre diagonal 36A y línea ferrea. (Iniciando Pavimento)

COMUNA 5





BARRANCABERMEJA, Carrera 43 entre calle 50By vía a Pozo Siete

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
ESTRUCTURA

Alcalde
Barranc



CANDELARIA, Carrera 34C entre calle 49ª al fondo con canalización.



CANDELARIA, Calle 52 Bis entre carreras 34C y 34D Vías Acceso por parte Baja

COMUNA 6





20 DE AGOSTO, Diagonal 62A Bis con Transversal 47A

COMUNA 7
Alcaldía de
Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA




VILLARELYS II, Calle 49ª entre carreras 53 y 54 – Detrás Villa Plata



VILLAREIYS II, Calle 50 entre carreras 53 y 53ª – Detrás Villa Plata



VILLARELYS II, Carrera 53 con calle 49ª al fondo – Detrás Villa Plata

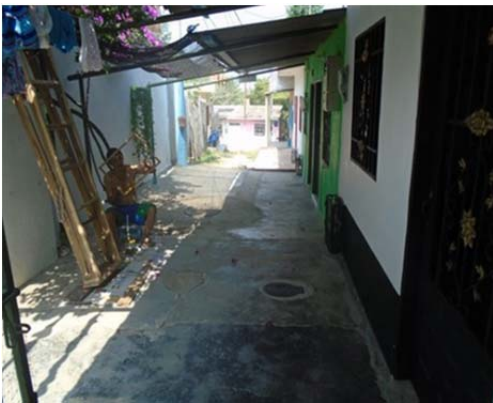

VILLARELYS II, Carrera 53B con calle 49 al fondo

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Articulación de Infraestructura Vial

Meta de Producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 25 kilómetros de la malla vial rural, durante el cuatrienio.

Realizaciones:

➤ MEJORAMIENTO SECTOR RURAL

- Vereda el Canelo, 11 Km, mejoramiento vial con material de río compactado.
- Vereda Cuatro Boca, 13 Km, mejoramiento vial con material de río compactado.
- Vereda Ciénega Brava, 10 Km, mejoramiento vial compactado.


CASCO URBANO

- Corregimiento El Llanito, 1300 ml, mejoramiento vial denso en frío.
- Vereda La Chava, 370 ml, mejoramiento vial con mezcla denso en frío.
- Vereda La Fore, 650 ml, mejoramiento vial con emoción y material base.
- Carretera Nacional, 1400 ml, mejoramiento vial y estabilización de fallo con material granular entre crudo, sus bases y relleno.
- Apoyo a trabajos vía Puerta del 11 – Campo 23

Evidencias:



Corregimiento el Llanito I

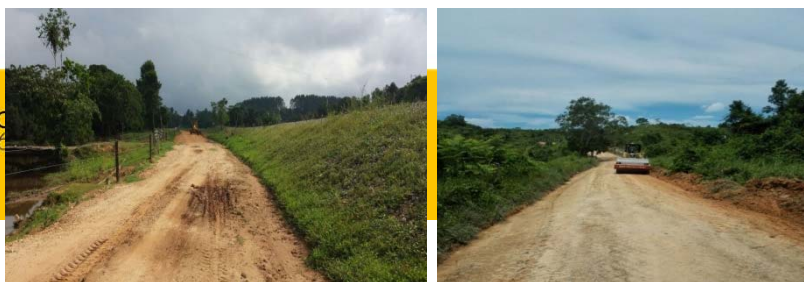



Vereda El Canelo

Dg. 60, Kilómetros
Teléfono: 6115



Programa: Articulación de Infraestructura Vial

Meta producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5 kilómetros de la malla vial urbana, durante el cuatrienio.

➤ SECTOR URBANO

- Barrio Jerusalén, 700 ml, mejoramiento vial en mezcla denso en frío.
- Barrio Nariño, 380 ml, mejoramiento vial en mezcla denso en frío.
- Barrio la Castellana, 80 ml, mejoramiento vial en mezcla denso en frío.
- Sector Comercial, 860 ml, mejoramiento vial en la calle 51, calle 50, carrera 1, carrera 1A, carrera 2da, carrera 3ra, carrera 4ta con mezcla denso en MDC.
- Barrio villa Nápoles, 170 ml, mejoramiento vial en mezcla denso en frío.

- Secretaria Infraestructura, 70 ml, mejoramiento vial en mezcla densa en caliente.



Barrio Jerusalén



Barrio el Nariño



Barrio la Castellana



Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Meta de Producto: Realizar la construcción y/o mantenimiento de un 1 kilómetros de andenes teniendo en cuenta las necesidades de la población en situación en discapacidad durante el cuatrienio.

Realizaciones:



Alcaldía de
Barrancabermeja

El proyecto consiste en la construcción de andenes cumplimiento con la norma de urbanismo y rampa para persona con algún grado de discapacidad. El proyecto nace para cumplir cinco acciones populares como el resultado de un juicio el cual se incluyeron cinco sitios como en el palacio de justicia, instalaciones antiguas antiguo movistar, centro del menor infractor, calle 48 con carrera 27 el recreo y calle 49 con carrera 18 hotel bachue I de los barrios beneficiados en las comunas 3, 4, 5, 6 y 7 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja, se ha socializado los alcances de las obras con las comunidades beneficiadas con el proyecto como son barrio el recreo, Colombia, buenos aires pueblo; donde ya se han realizado las actas de vecindad, replanteos, excavaciones, instalación de bordillos y fundida de concretos.

Proyecto: Bpim 20170680810024: Construcción de rampas y superficie táctil para la accesibilidad de personas con limitaciones física en el municipio Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente)

Contrato de Obra: No. 1530-17

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN RAMPAS Y SUPERFICIES TÁCTIL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON LIMITACIONES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Avance Físico: 25.2%

Valor Total: \$407.505.873,00

Valor Programado contrato de Obra: \$ \$407.505.873

Valor Ejecutado contrato de obra: \$101.924.753,85

Población Beneficiada del contrato de obra: toda la población con algún grado de discapacidad.

Impacto: mejor calidad de vida para la persona en discapacidad para un mejor acceso y comunidad al ingreso de un establecimiento público.

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: tres profesionales (arquitecto, ingeniero, hs)

Indirectos: nuevos personal para obra civil (obreros y maestro de obra)

Contrato de Interventoría: el contrato de obra No 1530-17 no tiene interventoría la realiza directamente la secretaria de infraestructura:



Evidencias

Alcaldía de
Barrancabermeja



PILAR: SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA: ARTICULACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta producto: Construir 200 Metros De Obras Para Estabilización De Taludes Durante El Periodo De Gobierno.

REALIZACIONES

El proyecto consiste en la intervención de 7 taludes en las diferentes zonas del Municipio de Barrancabermeja, los cuales presentan afectaciones en el terreno que ponen en riesgo las viviendas aledañas y habitantes, por ende se va a garantizar la estabilidad de los taludes mediante muros de contención y pantallas ancladas, al igual que la ejecución de obras de urbanismo y de manejo de aguas lluvias.

Hasta el momento se ha realizado la localización y replanteo de taludes, excavaciones, retiro de material de relleno y escombros, concreto ciclópeo, construcción de Muros de contención en concreto reforzado, instalación de anclajes activos, obras de urbanismo, instalación de barandas de seguridad.



Proyecto: # bpin y/o Bpim 20150680810022: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA BLANCA DURAN DE PADILLA BARRANCABERMEJA



Alcaldía de Barrancabermeja
Contrato de Obra: No. 0432-2017

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Avance Físico: 70%

Valor Total: \$7.484.802.427,44

Valor Programado contrato de Obra: \$7.484.802.427,44

Valor Ejecutado contrato de obra: \$ 5.239.361.699

Población Beneficiada del contrato de obra:

Comuna 3 - Barrio La Paz – 1468 habitantes
Comuna 4 – Barrio Ciudadela Cincuentenario – 531 habitantes
Comuna 4 – Barrio Tamarindos – 174 habitantes
Comuna 4 – Barrio Los Lagos – 947 habitantes
Comuna 5 – Barrio Primero de Mayo – 6904 habitantes
Comuna 7 – Barrio Altos del Campestre – 1240 habitantes
Comuna 7 – Barrio Minas del Paraíso – 1630 habitantes

Impacto

- Generar estabilidad y confiabilidad en los terrenos y taludes a intervenir por el proyecto.
 - Reducir el peligro generado por taludes y terrenos que presentan erosión e inestabilidad.
-
- Generar bienestar en la comunidad y valorización de las viviendas aledañas a los taludes a intervenir.

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: 1
Indirectos: 90

Contrato de Interventoría No. 0431-17

Avance: 70%



Valor Programado: \$523.939.150

Valor Ejecutado: \$366.757.405

Alcaldía de
Barrancabermeja

Empleos generados Interventoría:

Directos: 1

Indirectos: 8



Primero de Mayo



Barrio Los lagos



Barrio La Paz

PILAR: SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA: ARTICULACION INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta Producto: Realizar Mantenimiento y/o Rehabilitación de 25 km de Malla Vial Rural

Meta Producto Realizar Mantenimiento y/o Rehabilitación de 5Km de Malla Vial Urbana

OBJETO: Compra de insumos para el Mantenimiento de la maquinaria pesada para el mantenimiento mejoramiento y rehabilitación de la malla vial del Municipio de Barrancabermeja

% AVANCE TOTAL 53%

ESTADO

En ejecución



Otras actividades



GRUPO DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICISTAS
GRUPO DE CONSTRUCCIÓN ALBAÑILES
GRUPO DE CONSTRUCCIÓN PLOMEROS
GRUPO DE CONSTRUCCIÓN CARPINTEROS
GRUPO DE CONSTRUCCIÓN PINTORES



Instituciones educativas escuela primero de mayo, escuela la victoria, escuela el chico, escuela mary villamizar, escuela galvis galvis, escuela belén, colegio técnico de comercio, escuela cincuentenario, escuela lara parada, escuela libertad, colegio la fortuna, escuela las nieves, colegio casd, escuela primeras letras, colegio san marcos, escuela campo galán, escuela nueva granada, colegio industrial, colegio castillo.

Dependencias: craiv-uao, cárcel municipal, paz y convivencia, secretaria tic, infraestructura, polideportiva la victoria, c.c.c. , aspemuba, datacenter tic, sindicato, despacho alcalde, upj, secretaria general, , secretaria de salud, secretaria de educación, tesorería, registraduría, autopavimentación, punto vive boston, concejo municipal, gestora social, vivero municipal, cienaga del opon, parque camilo torres, política rural, cuatro bocas, contraloría, secretaria de gobierno, contabilidad, sisben, antigua comisaría de familia, planeación, control disciplinario, jurídica.

Realizaciones: Presupuestos Generales, Capacitación En Cursos Para Trabajo En Altura Y Espacios Confinados, Y Para Manejo Y Operación De Canchas Costraeco Y Aprque Infantil Y Ptar, instalación desmonte y mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados tipo ventana, cassette, minisplit piso techo, (repotenciación, limpieza, lavado, instalación y cambio de tuberías, vacío, carga, cambio de capacitores, reparación y cambio de tarjeta electrónica) , cambio de cables de acometidas de poste a contador, conexión de loncheras, instalación de medidores, instalación de radio enlaces, reparación de grecas, conexión de subacometidas temporales para soldadores, reparación de ventiladores, instalación de puntos eléctricos para puesto de trabajo nuevos, instalación de tuberías y ductos, revisión y adecuación de puestos de votación incluido la instalación de urnas triclave y carpas, instalación y reparación de líneas telefónicas, instalación,

y desmonte de ventiladores, reparación y recuperación de licuadoras y sandwicheras industriales para colegios, cambio de acometidas aéreas, conexión a soldadores, desmonte e instalación de tableros de distribución, nivelación de cargas, reparación de corto circuitos, revisión de portón eléctrico alcalde, cambio e instalación de tomacorriente, apagadores, , balastos, arrancadores, condensadores, fotoceldas, lámparas led, plafones, cambio de tubos para lámparas, y bombillos ahorradores, revisión y reparación de televisores, reparación e instalación de luminarias nuevas en los coliseos del colegio industrial y técnico de comercio, cambio de cantoneras, reparación de neveras, excavación para enterrar ductos para alimentación eléctrica reparación de




Alcaldía de
Barrancabermeja

bombas, hidrolavadoras, revisión de tomas regulados, instalación de cable para emisoras.

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Cárcel Municipal

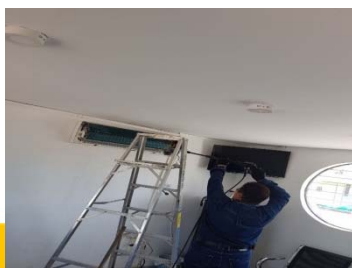

Dg. 60, Kilómetro 1 vía C. El Llanito.
Teléfono: 6115555,ext 1604-1605-1607





CRAIV

ACTIVIDADES DE ARBORIZACION Y VIVERO

Estas actividades apoyan a todas las metas producto, ya que donde se requiere la intervención de personal para poda, limpieza, emergencias por caída de árboles etc, se dispone del personal del área para la debida atención del tema.

- 1) Tala de árbol orejero barrio las colinas del sur
- 2) Poda de bambú por emergencia corregimiento el llanito – el guamo
- 3) Poda de moncoros y terminación de poda a bambú corregimiento el llanito – el guamo
- 4) Emergencia por caída de árbol barrio el chapinero
- 5) Emergencia vía principal autopista a Bucaramanga sector EROS



**Alcaldía de
Barrancabermeja**



- 6) Emergencia barrio el chapinero polideportiva caída de tronco
- 7) Terminación de trabajos barrio la victoria tala de ceiba
- 8) Poda de árbol orejero barrio el campestre
- 9) Poda de árbol oiti parque recreacional
- 10) Poda de embellecimiento de árboles cementerio principal la Resurrección
- 11) Emergencia de caída de árbol de por tormenta vía principal barrio el paraíso
- 12) Poda de descope árboles (4 oitis, 3 almendros, 2 pomorrosos) cancha de fútbol barrio la esperanza
- 13) Tala de árboles barrio cardales
- 14) Tala de árbol mango barrio 22 marzo
- 15) Tala de árboles frutales barrio el castillo
- 16) Tala de árboles barrio cardales
- 17) Poda de árboles nueva sede de los pensionados barrio buenos aires
- 18) Poda de árboles parte interna de la secretaria de infraestructura
- 19) Emergencia de árbol oiti barrio alcanzar
- 20) Poda de ceiba avenida la feria vía que conduce a fértil
- 21) Tala de árbol orejero barrio 16 de marzo sector la nueva juventud
- 22) Emergencia de árbol ficus por caída barrio galán
- 23) Emergencia cementerio municipal árbol oiti
- 24) Tala de árbol mango barrio san pedro Claver
- 25) Poda de árboles (10) parte interna de colegio 26 de marzo sede A barrio primero de mayo.
- 26) Tala de árbol IGO amarillo colegio la esperanza sede B
- 27) Poda de de ceiba vía principal pozo siete barrio villa plata
- 28) Emergencia de árbol mango barrio minas del paraíso
- 29) Tala de ceiba y palma de coco barrio los naranjos
- 30) Tala árboles moncorros (7) barrio los naranjos
- 31) Poda de árboles barrio la libertad
- 32) Tala de a árboles en mal estado barrio buenos aires
- 33) Ta de palmas (4) sector semáforo éxito
- 34) Poda de (3) árboles oiti sector semáforo éxito



Alcaldía de
Barrancabermeja



35) Tala de ceiba barrio villa plata

36) Emergencia de caída de árbol ficus barrio pueblo nuevo sector 40

37) Emergencia de caída de árbol gallinero y ficus

recreacional

38) Emergencia por caída de árbol mango barrio bosques de la cira

39) Emergencia de caída de árbol gallinero frente a infraestructura

40) Poda de emergencia de árbol mamoncillo antigua normal

41) Emergencia parque CAI cincuentenario

42) Poda de árboles(4) de pomorrosos y descope sector comercio detrás de telecom
– detrás de las CAS

43) Emergencia por caída de ramas de árboles barrio el campestre

44) Emergencia de caída de árbol Pomarroso y compensación del mismo barrio
Santander

45) Tala de árboles moncorros barrio campestre por lados del ancianato

46) Emergencia por caída de árbol gallinero oficinas de paz y convivencia

47) Tala de árbol de frutales sumglia barrio san judas

48) Emergencia caída de árbol gallinero barrio santana

49) Tala de árbol seco frete a la secretaria General sector comercial

50) Tala de árbol mango separador circunvalar

51) Emergencia caída de árbol frente la cancha cotraeco barrio galán

52) Emergencia por caída de árbol oiti barrio torcoroma

53) Emergencia caída de árbol sobre la vía del barrio 20 de enero

54) Emergencia caída de árbol vía principal a Refinería – Ecopetrol



Emergencia caída de árbol sector EROS



ANTES



DESPUES

METAS PRODUCTO DE OTRAS DEPENDENCIAS ENTREGADAS A INFRAESTRUCTURA POR DELEGACION

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PILAR: SEGURIDAD HUMANA

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: 5.1.5.3 Fortalecimiento Institucional por la Seguridad si es posible

Meta de Producto: Mantener el Apoyo a los 5 organismos de Seguridad y convivencia de conformidad al Acuerdo 020 del 2011 durante el cuatrenio.

Realizaciones: La obra inicia con la demolición de la edificación existente, después de que la defensa civil realizara desmonte de carpintería metálica, cubierta y demás elementos que podían ser reutilizados por ellos, se continua con actividades de localización y replanteo del predio existente, se inicia la construcción del campamento de obra en un predio contiguo a la obra en donde se almacenan los insumos para la obra, se realiza cerramiento con lona verde el cual es reemplazado en varias ocasiones debido a



Alcaldía de
Barrancabermeja


BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

los daños generados por personas ajenas a la obra, se inicia con el desmonte de la capa vegetal en la parte posterior a la edificación existente, se real... provisionales de acueducto y energía que se emplearán durante el... se realiza instalación de valla informativa, debido a la comp...

las profundidades establecidas en el estudio de suelos y planos estructurales el terreno no tenía material adecuado para cimentar el proyecto se realiza requerimiento al consultor del proyecto para dar claridad a este tema en donde la información del estudio de suelos no es coincidente con el material encontrado en obra así como otras observaciones referentes a la parte arquitectónica y estructural, pero las respuestas del consultor no son satisfactorias, por esto se aprueba la realización de un nuevo estudio de suelos en donde se determina que el estudio inicial no puede tenerse en cuenta ya que a las profundidades especificadas en el estudio inicial no hay suelo portante, se determina que se debe realizar un mejoramiento de la estructura del terreno donde se cimentara la estructura, se inicia así el proceso de excavación mecánica del material que no es apto hasta el nivel indicado en el nuevo estudio de suelos, durante esta excavación sobre la diagonal 60 contra la cancha de futbol se encuentran dos tuberías de concreto de 24" las cuales conducen aguas negras y las cuales después de una visita realizada por la empresa aguas de Barrancabermeja estas tuberías solo debería conducir aguas lluvias, no puede ser interrumpido ya que es colector de una quebrada aguas arriba, por esto de aprueba la reinstalación de las dos líneas de tuberías afectadas durante la excavación y su posterior protección con un cajón en concreto que evite las afectaciones a las tuberías ya que encima de estas queda el parqueadero de las bodegas de la Defensa Civil, se realiza sondeo de las dos líneas aguas arriba u aguas abajo con equipo de presión succión.

Se continua con la excavación mecánica y se procede a realizar el mejoramiento del terreno aplicando una capa de material granular que funcionara como filtro, la instalación de un geo textil no tejido, y relleno con recebo compactado, dentro de las observaciones al consultor se referencia que el nivel de las edificaciones vecinas (ICBF y cancha de futbol)quedan por debajo del nivel de la placa de contrapiso de la edificación a construir lo cual requiere la construcción de contenciones que eviten afectaciones a las edificaciones vecinas, se inicia el proceso de construcción de muros de contención y tanque de almacenamiento así como del muro de cerramiento perimetral contra el icbf y la cancha de futbol, se finalizan estas actividades junto con el relleno con recebo compactado y se procede a realizar las excavaciones de la cimentación (zapatas y vías de amarre) de la edificación, se inicia con la instalación de redes de aguas lluvias, potable, sanitaria y eléctrica que van en el piso junto con sus cajas de inspección, se realiza revisión y modificaciones del sistema sanitario y aguas lluvias por parte de la interventoría y se adicionan unos pozos de inspección para poder hacer las respectivas descargas a los sistemas de conducción, se realiza corte y figurado de acero de refuerzo según planos estructurales e indicaciones de la interventoría.

Se inicia la construcción de columnas y pantallas según planos, se realiza vaciado de placa de contrapiso y construcción de cárcamos en concreto, se realiza modificación al sistema de placa de entrepiso aproado por la interventoría y se procede a la instalación del entarimado, lamina de metaldeck malla electrosoldada, conectores de cortante y vaciado de placa de entrepiso, se inicia con actividades de mampostería en el primer



piso, se inicia construcción de estructura para pérgola, se inicia construcción de columnas de segundo nivel vaciado de vigas aéreas de segundo nivel, se realiza instalación de contraincendio, se realiza instalación de bordillos separados para parqueaderos y cafetería, se evidencia que ante la ausencia de mampostería hay muchos muros de mampostería que no quedan confinados además que por ser ladrillo farol (de perforación horizontal) no se podría instalar la carpintería metálica (puertas y ventanas), es por esto que la interventoría autoriza a la construcción de viguetas y columnetas para confinar estos muros y permitir el anclaje de estos elementos, se funde placa de torre de comunicaciones, culatas en mampostería y viga de remate en las culatas para poder anclar la estructura metálica de cubierta, se realiza la instalación de losetas para andenes, instalación de red de gas, instalación de contador de acueducto, conexión de sistema potable al tanque de almacenamiento, pañetes. Al día de hoy la obra ya se encuentra recibida en su FASE I.

Proyecto: 20140680810040 CONSTRUCCIÓN ESCUELA Y SEDE DE LA DEFENSA CIVIL BARRANCABERMEJA

Contrato de Obra No. 2085 del 2015

Objeto del Contrato: Fase I de la Construcción Escuela y Sede de la Defensa Civil en Barrancabermeja

Avance Físico: 100,00%

Valor Total: 2.569.584.433,95

Valor Programado contrato de Obra: \$ 2.569.584.433,95

Valor Ejecutado contrato de obra: \$ 2.565.961.856

Población Beneficiada del contrato de obra: Todo el Municipio de Barrancabermeja

Impacto: (Al menos dos impactos)

Empleos generados contrato de Obra:

Directos 120
Indirectos 70

Contrato de Interventoría No. 1259 del 2016

Avance: 100,00%



Valor Programado: \$ 222.773.360,00

Valor Ejecutado: \$ 222.773.360,00

**Alcaldía de
Barrancabermeja**

Empleos generados Interventoría:

Directos 10

Indirectos 8



Evidencias:



INICIO DE OBRA



EXCAVACION



RELLENOS



OBRA EN EJECUCIÓN



COMITÉ DE OBRA



ENSAYOS DE LABORATORIO



TERMINACIÓN I FASE



Impactos:

Alcaldía de
Barrancabermeja



Generar seguridad en la población para la prevención a riesgos inminentes y atención inmediata de los desastres y calamidades y como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: **BARRANCABERMEJA SEGURA**

Programa: **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE.**

Meta de Producto: Mantener el apoyo durante el cuatrienio a cinco organismo de seguridad según la ley 1421 del 2010-fonset de acuerdo plan integral de seguridad y convivencia ciudadana durante el cuatrienio

Realizaciones:

El proyecto consiste en la adecuación de las zonas de batería sanitarias y zonas de dormitorios para el personal de oficiales y soldados al igual de la zona de casino y cocina en el batallón BAEEV No 7 del municipio de

Proyecto: Bpim 20160680810045: Apoyo a organismo de seguridad según ley 1421 de 2010-FONSET en el municipio de Barrancabermeja.

Contrato de Obra: No. 0466-17

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE TROPA DE LA UNIDAD TÁCTICA INSTALACIONES BATALLÓN BAEEV QUE SE DERIVE DEL APOYO A ORGANISMO DE SEGURIDAD SEGÚN LEY 142 DE 2010 FONSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Avance Físico: 100 %

Valor Total: \$785.414.813,00

Valor Programado contrato de Obra: \$785.414.813,00

Valor Ejecutado contrato de obra: \$785.414.813,00



Población Beneficiada del contrato de obra: la población hace referencia al ydo. personal del Batallón del BAEV.



Alcalde de Barrancabermeja

Impacto: mejor calidad de vida para el personal de soldados y su servicio militar en el batallón del BAEV No 7 quienes protegen la infraestructura energética de la zona.

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: tres profesionales (arquitecto, ingeniero civil, hs)

Indirectos: quince personas para obra civil (obreros y maestro de obra)

Contrato de Interventoría No. 0563-17

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE TROPA DE LA UNIDAD TÁCTICA INSTALACIONES BATALLÓN BAEV QUE SE DERIVE DEL APOYO A ORGANISMO DE SEGURIDAD SEGÚN LEY 142 DE 2010 FONSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Avance: 100%

Valor Total: \$78.444.800,00


Valor Programado: \$78.444.800,00

Valor Ejecutado: \$78.444.800,00

Empleos generados Interventoría:

Directos: tres profesionales

Indirectos: un inspector de obra

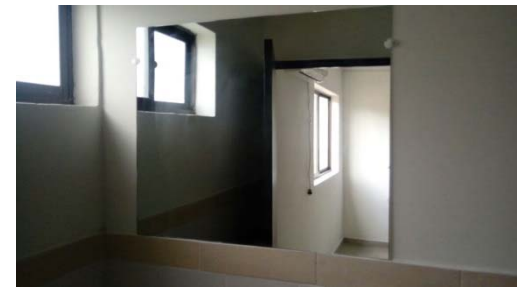

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE.

Programa: **LÍNEA ESTRATÉGICA BARRANCABERMEJA SEGURA**

OBJETIVO: Objetivo: Apoyar a los Organismos de Seguridad y convivencia a efectos de garantizar a la población espacios de bienestar y tranquilidad en ambientes de tolerancia y paz.

Meta de Producto: Mantener el apoyo durante el cuatrienio, a cinco (5) organismos de seguridad y convivencia de conformidad al acuerdo 020 de 2011 durante el cuatrienio.

Realizaciones:

Diseñar para la Policía Nacional, seccional Magdalena Medio, los edificios para el servicio de operación de SIJIN, GAULA y SIPOL. Lo anterior se debe realizar a tal detalle que los mismos puedan construirse durante la presente administración.



Proyecto: #20120680810131: APOYO AL FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES- FONSET-LEY 1421 DE 2010
BARRANCABERMEJA, SANTANDER



Alcaldía de
Barrancabermeja
Contrato de Obra: No. 2073-16

Objeto del Contrato: “ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO A DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN UNIFICADA PARA LA LIBERTAD PERSONAL (GAULA), SECCIONAL DE INTELIGENCIA (SIPOL), Y SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (SIJÍN) DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”

Avance Físico: 34.00%

Valor Total: \$1.089.943.830

Valor Programado de la consultoría: \$726.629.220

Valor Ejecutado contrato: \$514.453.487,76 INCLUIDO EL ANTICIPO

Población Beneficiada del contrato: CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Impacto:

1. JERARQUÍA EN LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS ÁREAS A LAS CUALES A PUNTA EL DISEÑO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA
2. MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD ESPACIAL, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL PARA LOS EMPLEADOS QUE PRESTAN SU SERVICIO A LAS ENTIDADES DE SIPOL, GAULA Y SIJÍN.

Empleos generados contrato de Obra:

Directos	26
Indirectos	9

Contrato de Interventoría No. 1971-16

Avance: 34.00%

Valor Programado: \$69.588.104,66

Valor Ejecutado: \$34.794.052,33

Empleos generados Interventoría:



Directos
Indirectos

6
2

Alcaldía de
Barrancabermeja



FOTO 1. La imagen corresponde a la fachada de ingreso entre el cruce de la carrera 28 y avenida circunvalar.



Alcaldía
Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA
ES POSIBLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



FOTO 2. La imagen corresponde a vista aérea de las edificaciones que comprenden el complejo institucional al servicio de gaula, sijin, sipol y habitacional.

SECRETARIA DE GOBIERNO

PILAR: Seguridad Humana

LINEA ESTRATEGICA: BARRANCABERMEJA SEGURA

PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional por la Seguridad SI ES POSIBLE



Alcaldía de
Barrancabermeja



Meta Producto: Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de convivencia, de conformidad al acuerdo 020 de 2011 durante el año 2017.

REALIZACIONES: Construcción de obras civiles y adecuaciones locativas para el mantenimiento y mejoras del alojamiento 1A del personal de tropa de la unidad táctica del batallón BAGRA.

PROYECTO: 20160680810045 APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SEGÚN LEY 1421 DE 2010 – FONSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

No. CONTRATO: 0465-17

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED SANITARIA CON CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL PARA EL ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE TROPA DE LA UNIDAD TACTICA (6 ALOJAMIENTOS) Y PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA EL ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD TACTICA (1 ALOJAMIENTO) EL BAGRA QUE SE DERIVE DEL APOYO A ORGANISMOS DE SEGURIDAD SEGÚN LA LEY 1421 DE 2010 FONSET EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$773.581.081,00)

%DE AVANCE TOTAL: 80%

POBLACION BENEFICIADA: Un personal flotante de 200 personas (soldados, oficiales, altos mandos).

IMPACTO:

- ✓ Mejoramiento en la calidad de vida del personal del batallón BAGRA.
- ✓ Brindar mayor seguridad a las instalaciones del batallón BAGRA.

EMPLEOS GENERADOS CONTRATO DE OBRA:

- ✓ Directos: 1
- ✓ Indirectos: 17

ESTADO: EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL CONTRATO: SEIS (06) MESES

ACTA DE INICIO: MARZO 28 DE 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 27 DE 2017



Alcaldía de
Barrancabermeja

ACTA DE SUSPENSION 01: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTA DE PRORROGA 01 A LA SUSPENSION 01: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTA DE REINICIO 01: 02 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA DE FINALIZACION: 17 DE OCTUBRE DE 2017



SECRETARÍA DE EDUCACION

Pilar: Cultura Ciudadana

Línea estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso

Programa: Mantener cobertura y permanencia en el sistema educativo

Meta de Producto: Adecuar y/o Remodelar la infraestructura de tres instituciones educativas dentro del cuatrenio.

Realizaciones: Es de manifestar que la Institución no contaba con una estructura física y eléctrica acorde a las exigencias educativas y educacionales para impartir ciclos de formación basados en aprendizajes técnicos, tecnológicos y/o científicos, implicando con ello una desmejora significativa en la implementación de la calidad en educación. Por tal razón, se realizó el proyecto que consiste en las instalaciones eléctricas y de obra en el taller de mecánica, con miras a mejorar las condiciones no solo del personal docente, sino también estudiantil; De igual forma que tengan la posibilidad de aprender una ciencia y una técnica.



Alcaldía de
Barrancabermeja

Proyecto: 20150680810039 AMPLIACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRAS CIVILES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD JOSÉ PRUDENCIO PADILLA DE MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



Contrato de Obra No. 1251 del 2016

Objeto del Contrato: Ampliación instalaciones eléctricas y obras civiles de la institución educativa CASD José Prudencio padilla de municipio de Barrancabermeja, Santander

Avance Físico: 100,00%

Valor Total: 1.383.343.318

Valor Programado contrato de Obra: \$ 1.383.343.318

Valor Ejecutado contrato de obra: \$ 1.383.343.318

Población Beneficiada del contrato de obra: Todo los estudiantes del Colegio el CASD

Empleos generados contrato de Obra:

Directos 25

Indirectos 15

Contrato de Interventoría No. 1259 del 2016

Avance: 100,00%

Valor Programado: \$ 152.614.245,00

Valor Ejecutado: \$ 152.614.245,00

Empleos generados Interventoría:

Directos 6

Indirectos 3




INICIO DE OBRA



OBRA EN EJECUCIÓN



COMITÉ DE OBRA

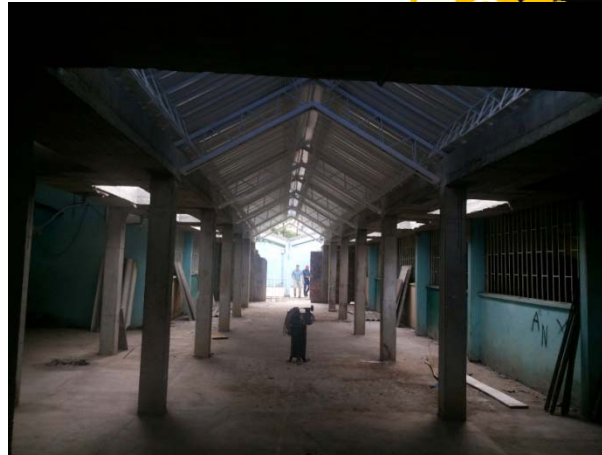

OBRA CIVIL EN 80,00%



OBRA TERMINADA

LINEA ESTRATEGICA: EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

PROGRAMA: MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO



META PRODUCTO: ADECUAR Y/O REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DURANTE EL CUATRIENIO



Alcaldía de
Barrancabermeja

Nº CONTRATO:

0681-17

OBJETO:

“CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGROPECUARIO LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, PRIMERA ETAPA, CENTRO ORIENTE”

VALOR DEL CONTRATO:

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$7.258.816.660,32)

PLAZO DEL CONTRATO:

DOCE (12) MESES.

ACTA DE INICIO:

ABRIL 18 DE 2017.

FECHA DE FINALIZACIÓN: ABRIL 17 DE 2018.

% DE AVANCE TOTAL:

38%

ESTADO:

EN EJECUCIÓN

POBLACION

BENEFICIADA:

800 NIÑOS Y NIÑAS DEL CORREGIMIENTO LA FORTUNA

ALCANCE DEL



Alcaldía de
Barrancabermeja

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGROPECUARIO LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, PRIMERA ETAPA, CENTRO ORIENTE



INTERVENTORIA

No CONTRATO: 0696-15

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGROPECUARIO LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, PRIMERA ETAPA, CENTRO ORIENTE”

VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MCTE (\$376.201.602,00)

ACTA DE INICIO: ABRIL 18 DE 2017

PLAZO: DOCE (12) MESES

% AVANCE TOTAL: 38%

CORREGIMIENTO: LA FORTUNA



Alcaldía de
Barrancabermeja

POBLACION BENEFICIADA:
LA FORTUNA

800 NIÑOS Y NIÑAS DE CORREGIMIENTO



ALCANJE DEL CONTRATO: INTERVENTORIA

ESTADO: EN EJECUCIÓN

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Mantener cobertura y permanencia en el sistema educativo

Meta de Producto: Adecuar y remodelar la infraestructura de tres (3) instituciones educativas

Realizaciones:

El proyecto consistió en la intervención de tres áreas en las instalaciones físicas de la Institución Educativa el Castillo descritas a continuación: ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE AULAS Y ÁREA RECREATIVA. Estas áreas contemplaron actividades como muro de contención, pisos en cerámica, cielorraso en sistema DRYWALL, lámparas, Estuco, Ventiladores, pintura interior y exterior.

Proyecto: # BPIN 2015680810008: Mejoramiento de las instalaciones físicas institución educativa el Castillo Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente)

Contrato de Obra: No. 2123-16

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO BARRANCABERMEJA

Avance Físico: 100%



Valor Total: \$3.120. 191.878

Valor Programado contrato de Obra: \$3.120.191.878

Alcaldía de Barrancabermeja
Valor Ejecutado contrato de obra: \$3.120.191.878



Población Beneficiada: 600 estudiantes

Impacto:

- Calidad en el ambiente físico educativo
- Calidad en el aprendizaje

Empleos generados contrato de Obra:

Directos: 56 empleos

Indirectos

Contrato de Interventoría No. 2067-16

Avance: 100%

Valor Programado: \$ 221.158.152

Valor Ejecutado: \$ 221.158.152

Empleos generados Interventoría:

Directos: 6 empleos

Indirectos: 1 empleo

Evidencias:



Alcal
Barranc

BARRANCABERMEJA




Área parque recreativo



Área administrativa



Área parque recreativo

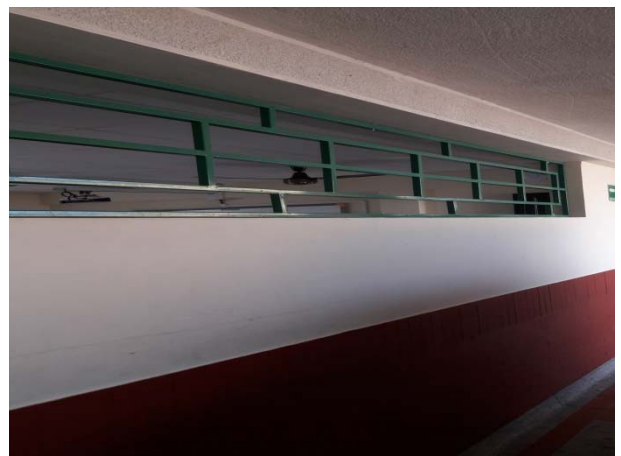

Área de aulas

SECRETARIA DE EDUCACION

PILAR: Seguridad Humana

Dg. 60, Kilómetro 1 vía C. El Llanito.
Teléfono: 6115555,ext 1604-1605-1607



LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO



Alcaldía Educativa
Barrancabermeja

META PRODUCTO: Adecuar y/o remodelar la infraestructura para la atención en educación inicial en 4 sedes educativas del sector urbano durante el cuatrienio.

REALIZACIONES: Construcción y ampliación del Centro de Desarrollo Infantil CDI Semillitas para ampliar la cobertura de atención de niños de 0 a 5 años en la comuna 7 del Municipio de Barrancabermeja.

PROYECTO: 20120680810041 CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.

No. CONTRATO: 2017-15

OBJETO: CONSTRUCCION Y AMPIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI SEMILLITAS MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

VALOR DEL CONTRATO: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIETOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$1.281.428.226, 00)

% DE AVANCE TOTAL: 60%

POBLACION BENEFICIADA: APROX 400 NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS

IMPACTO:



**Alcaldía de
Barrancabermeja**

Se amplía la cobertura para la atención de los niños de 0 a 5



Calidad de vida para los niños y sus madres de esta zona

EMPLEOS GENERADOS CONTRATO DE OBRA:

- ✓ Directos: 1
- ✓ Indirectos 19

ESTADO: EN EJECUCIÓN

EVIDENCIAS



PLAZO DEL CONTRATO: OCHO (08) MESES.

ACTA DE INICIO: ENERO 19 DE 2017.

FECHA DE FINALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 18 DE 2017.

ADICIONAL EN PLAZO N° 01: SEPTIEMBRE 12 DE 2017.



PLAZO ADICIONAL N° 01: DOS (02) MESES



Alcaldía de Barrancabermeja
FECHA DE FINALIZACIÓN: NOVIEMBRE 18 DE 2017

Pilar: Seguridad Humana

LINEA ESTRATEGICA: DEPORTE Y RECREACION.

Programa: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Meta de Producto: Realizar cuatro (4) adecuaciones, mejoramientos y/o conservaciones de escenarios deportivos del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

Realizaciones:

Consiste en la construcción de las áreas urbanas entre andenes, senderos y zonas verdes para los costados oriente y occidente del Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata, incluyendo el mobiliario como bancas, contenedores de raíces, árboles, y canecas para la basuras. A su vez el proyecto también contempla la construcción de una plaza en forma de triángulo, dada la morfología del terreno entre el Estadio de Fútbol y el Estadio de Beisbol.

Proyecto: #20120680810037: RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Contrato de Obra: No. 1719-15

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANISMO FASE III EN EL ESTADIO DANIEL VILLA ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Avance Físico: 85.04%

Valor Total: \$2.428.647.950

Valor Programado contrato de Obra: \$2.428.647.950

Valor Ejecutado contrato de obra: \$2.071.817.939,82



Población Beneficiada del contrato de obra: CASO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA



Impacto:
Alcaldía de
Barrancabermeja

1. MEJORAMIENTO EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS PEATONES PARA EL INGRESO AL ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA Y SUS EXTERIORES
2. SEGURIDAD EN LA DISPOSICIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS ÁREAS URBANAS AL SERVICIO DEL TRANSEÚNTE Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Empleos generados contrato de Obra:

Directos	15
Indirectos	8

Contrato de Interventoría No. 1724-15

Avance: 61.07%

Valor Programado: \$161.137.051

Valor Ejecutado: \$107.573.707

Empleos generados Interventoría:

Directos	4
Indirectos	2



Alcaldía de
Barrancabermeja

Evidencias:



FOTO 1. La imagen corresponde al sector de la plazoleta entre el estadio de béisbol y el estadio de fútbol.



FOTO 2. La imagen corresponde al corredor o sendero peatonal del costado oriente del estadio de fútbol



FOTO 3. La imagen corresponde a los trabajos de construcción para el sendero, y zona verde del costado occidente del estadio de fútbol.



**Alcaldía de
Barrancabermeja**

CONCLUSIONES

Se ha podido cumplir con las metas propuestas en cada uno de los contratos de Obra, aunque con los contratiempos propios de la Administración Pública; hemos gestionado a cada paso el cumplimiento de éstas.

Asimismo, es necesario tener en cuenta la ola invernal que nos ha aquejado y que en muchas ocasiones no permite cumplir con todas las labores a tiempo; ya que debemos cubrir las emergencias que por el clima se presentan en terrenos, vías, arborización, etc.

Esperamos continuar con el apoyo del Honorable Concejo Municipal para continuar al frente de estas labores para el beneficio de la comunidad en general.

Atentamente,

Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ

Secretario de Infraestructura

